

Etat d'avancement du déploiement

Edition juin 2023


Quelques points d'attention :

- Les données partagées correspondent aux nombres de locaux résidentiels ou professionnels identifiés dans nos systèmes d'informations techniques. Elles sont utilisées notamment pour dimensionner notre réseau. Elles intègrent à la fois les locaux existants **mais aussi** des locaux en cours de construction ou des locaux appartenant à des projets immobiliers non encore démarrés. Cela signifie que tous les logements existants d'une commune peuvent être éligibles à la fibre sans pour autant que cette commune soit identifiée à 100% dans nos chiffres (du fait des projets à venir).
- A ce stade de finalisation du déploiement initial, les exercices de prévisions à la commune sont devenus beaucoup trop sensibles aux phénomènes d'aléas opérationnels. Nous avons préféré suspendre la diffusion de cette information à forte variabilité .
- Les données concernant la « CC de Laval Agglomération » ne concernent que les communes appartenant à la « CC du Pays de Loiron » avant regroupement communautaire.
- La « CC de Sablé-sur-Sarthe » ne concerne que la ville de Bouessay (et n'est donc pas détaillée)

Pour bien lire les graphiques à venir

La poursuite du déploiement de ces locaux nécessite une autorisation ou un accord de la part d'un Tiers que nous n'avons pas encore eu.
Le déploiement est donc bloqué.
Dès que l'autorisation est obtenue, les locaux basculent dans la catégorie « locaux en cours de déploiement »


Les locaux sont éligibles à la Fibre et les habitants peuvent souscrire un abonnement Fibre auprès de leur opérateur commercial

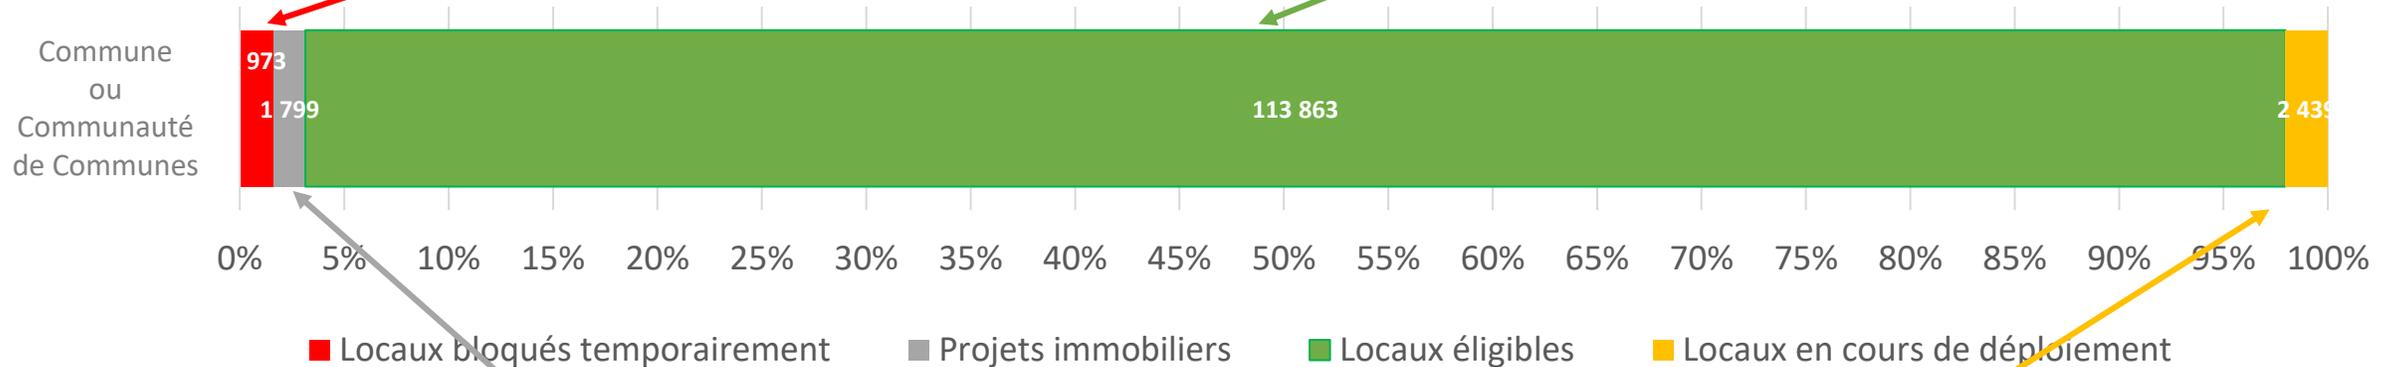


Le nombre correspond soit à des locaux en cours de construction, soit à des locaux appartenant à des projets immobiliers non encore finalisés et pour lesquels nous avons été informés.

Le nombre correspond aux locaux qu'il nous reste à rendre éligibles et pour lesquels nous n'avons pas, à date, identifié de blocage significatif (refus d'un Tiers par exemple). Cette catégorie peut être fluctuante au gré des blocages/déblocages que nous rencontrons.


Etat d'avancement du déploiement global

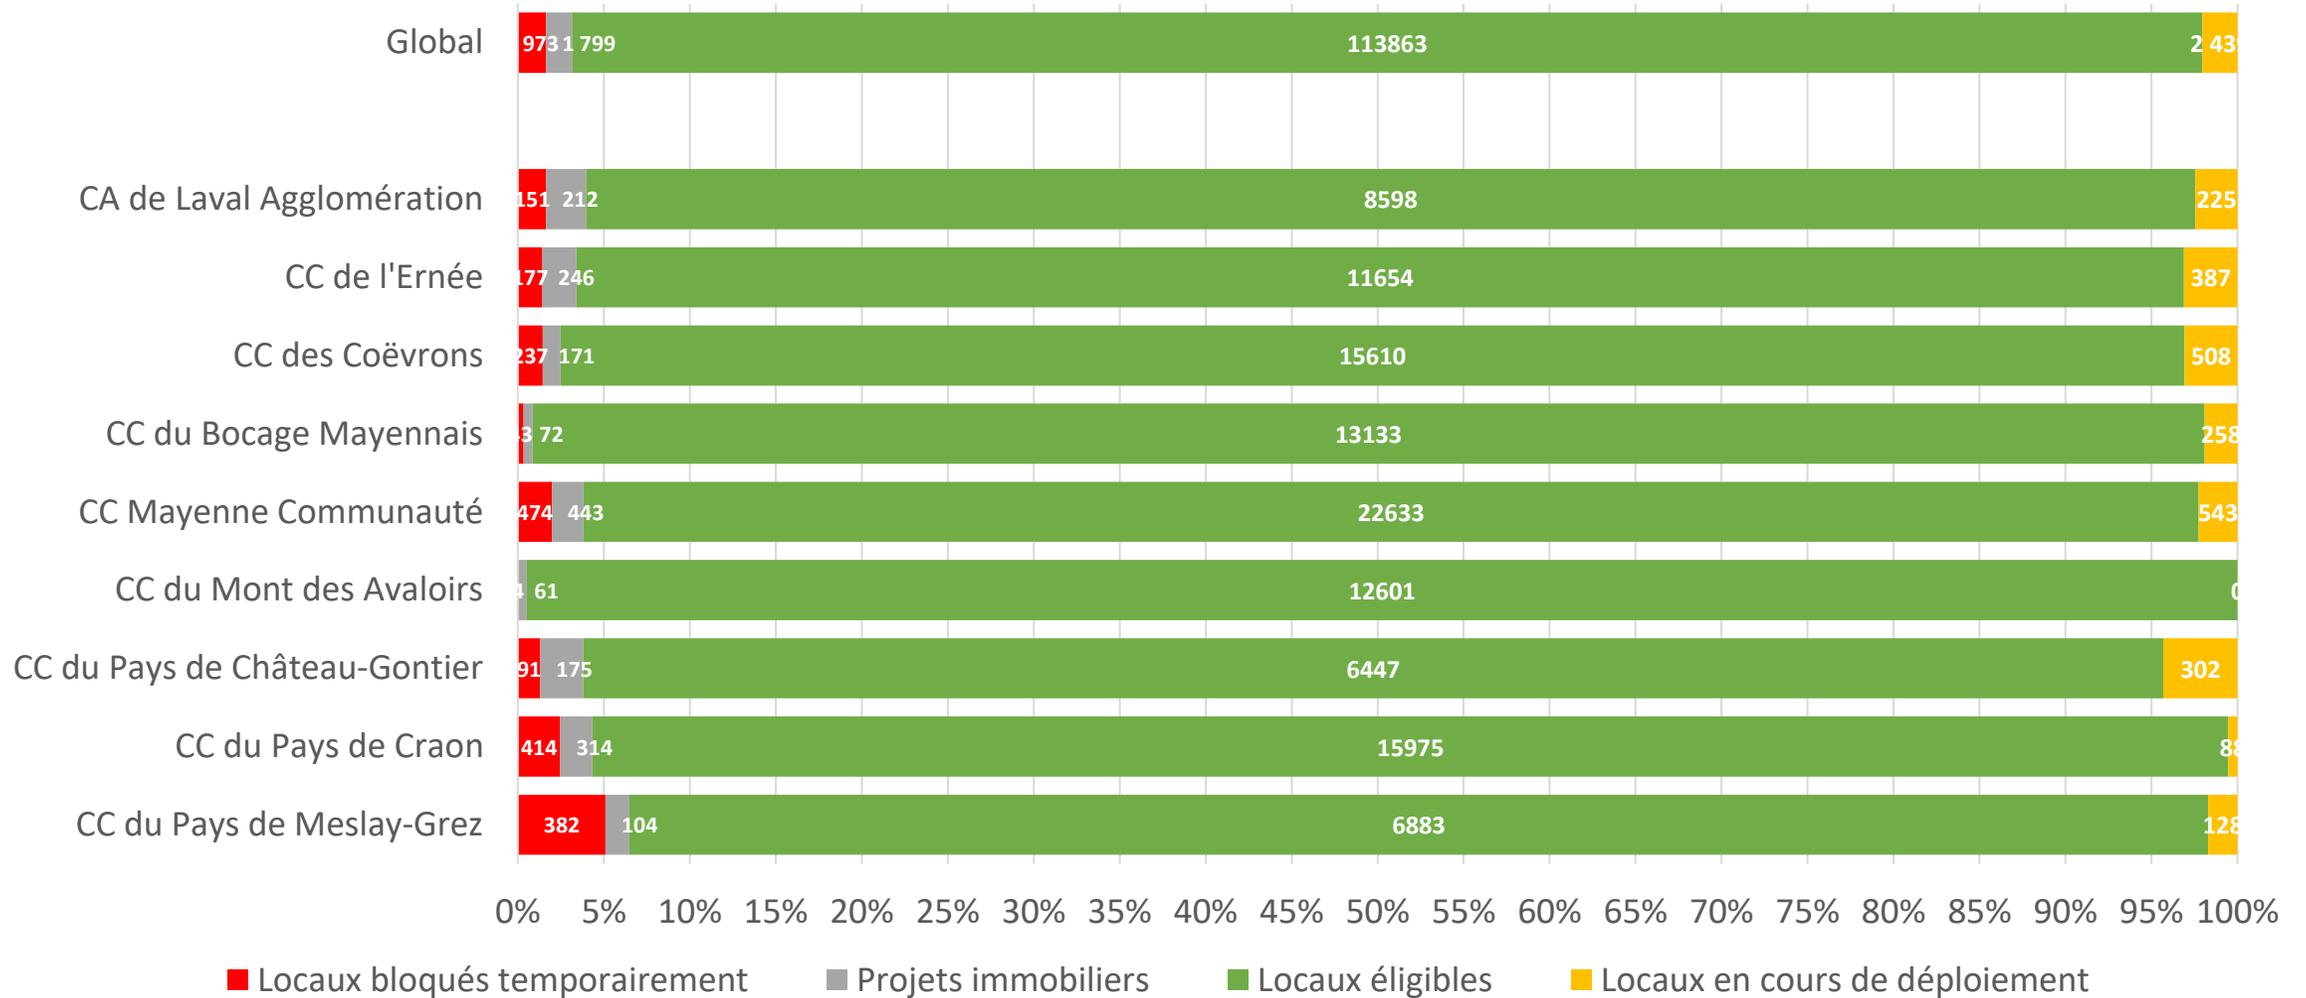

C.C. du Bocage Mayennais (1/2)

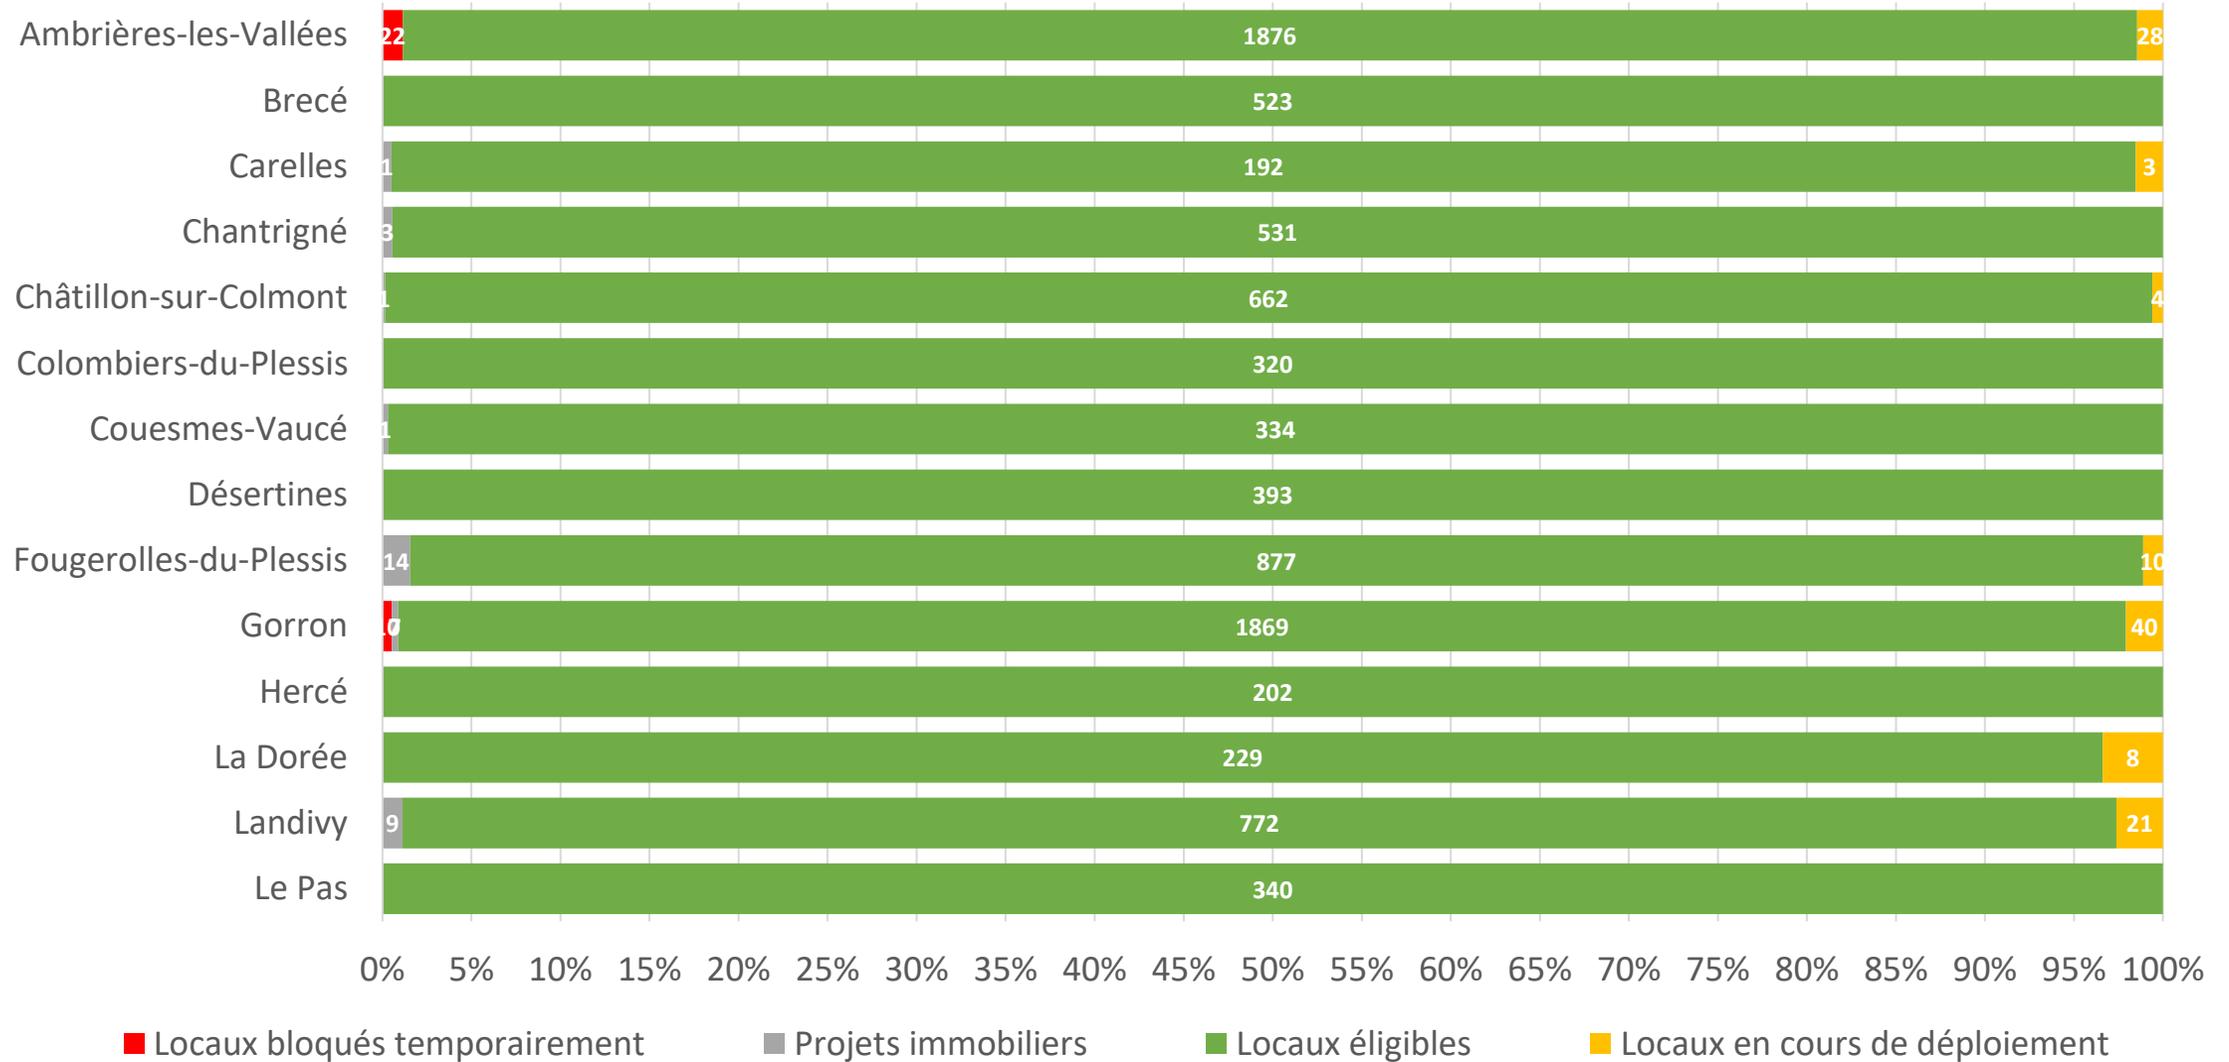

C.C. du Bocage Mayennais (2/2)

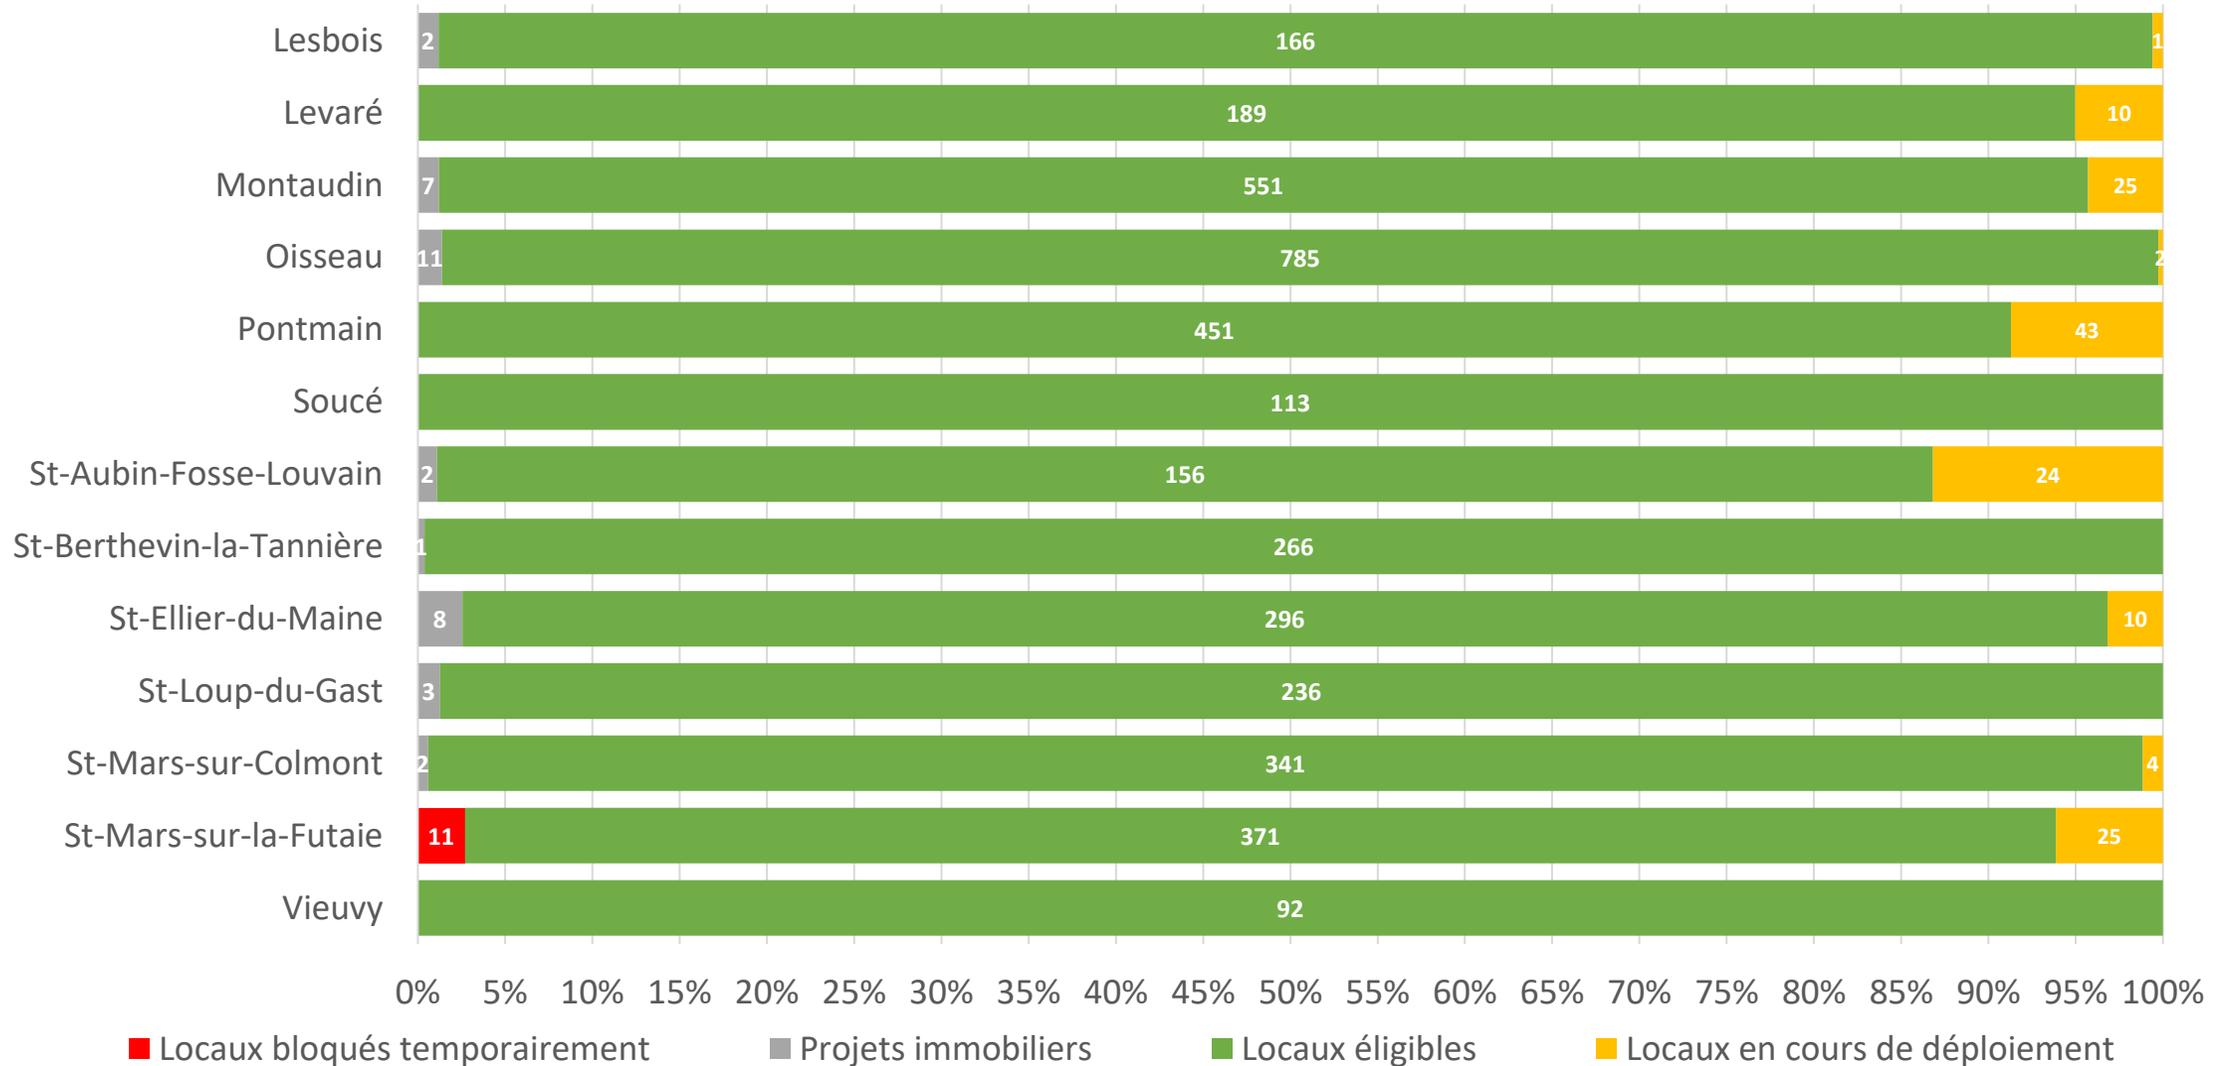


L'actualité de la C.C. du Bocage Mayennais



- **St-Aubin-Fosse-Louvain** : Des travaux d'enfouissement et de rénovation de l'éclairage public ont été réalisés sur la commune de Lesbois, rue de la Colmont. Afin de déployer la fibre sur ce secteur et la commune voisine de St-Aubin-Fosse-Louvain, nous devons disposer du positionnement des réseaux existants en sous-sol avant de lancer les travaux de génie civil. Nous sommes actuellement en attente de ces informations pour lancer le chantier de déploiement.

C.C. des Coëvrons (1/2)

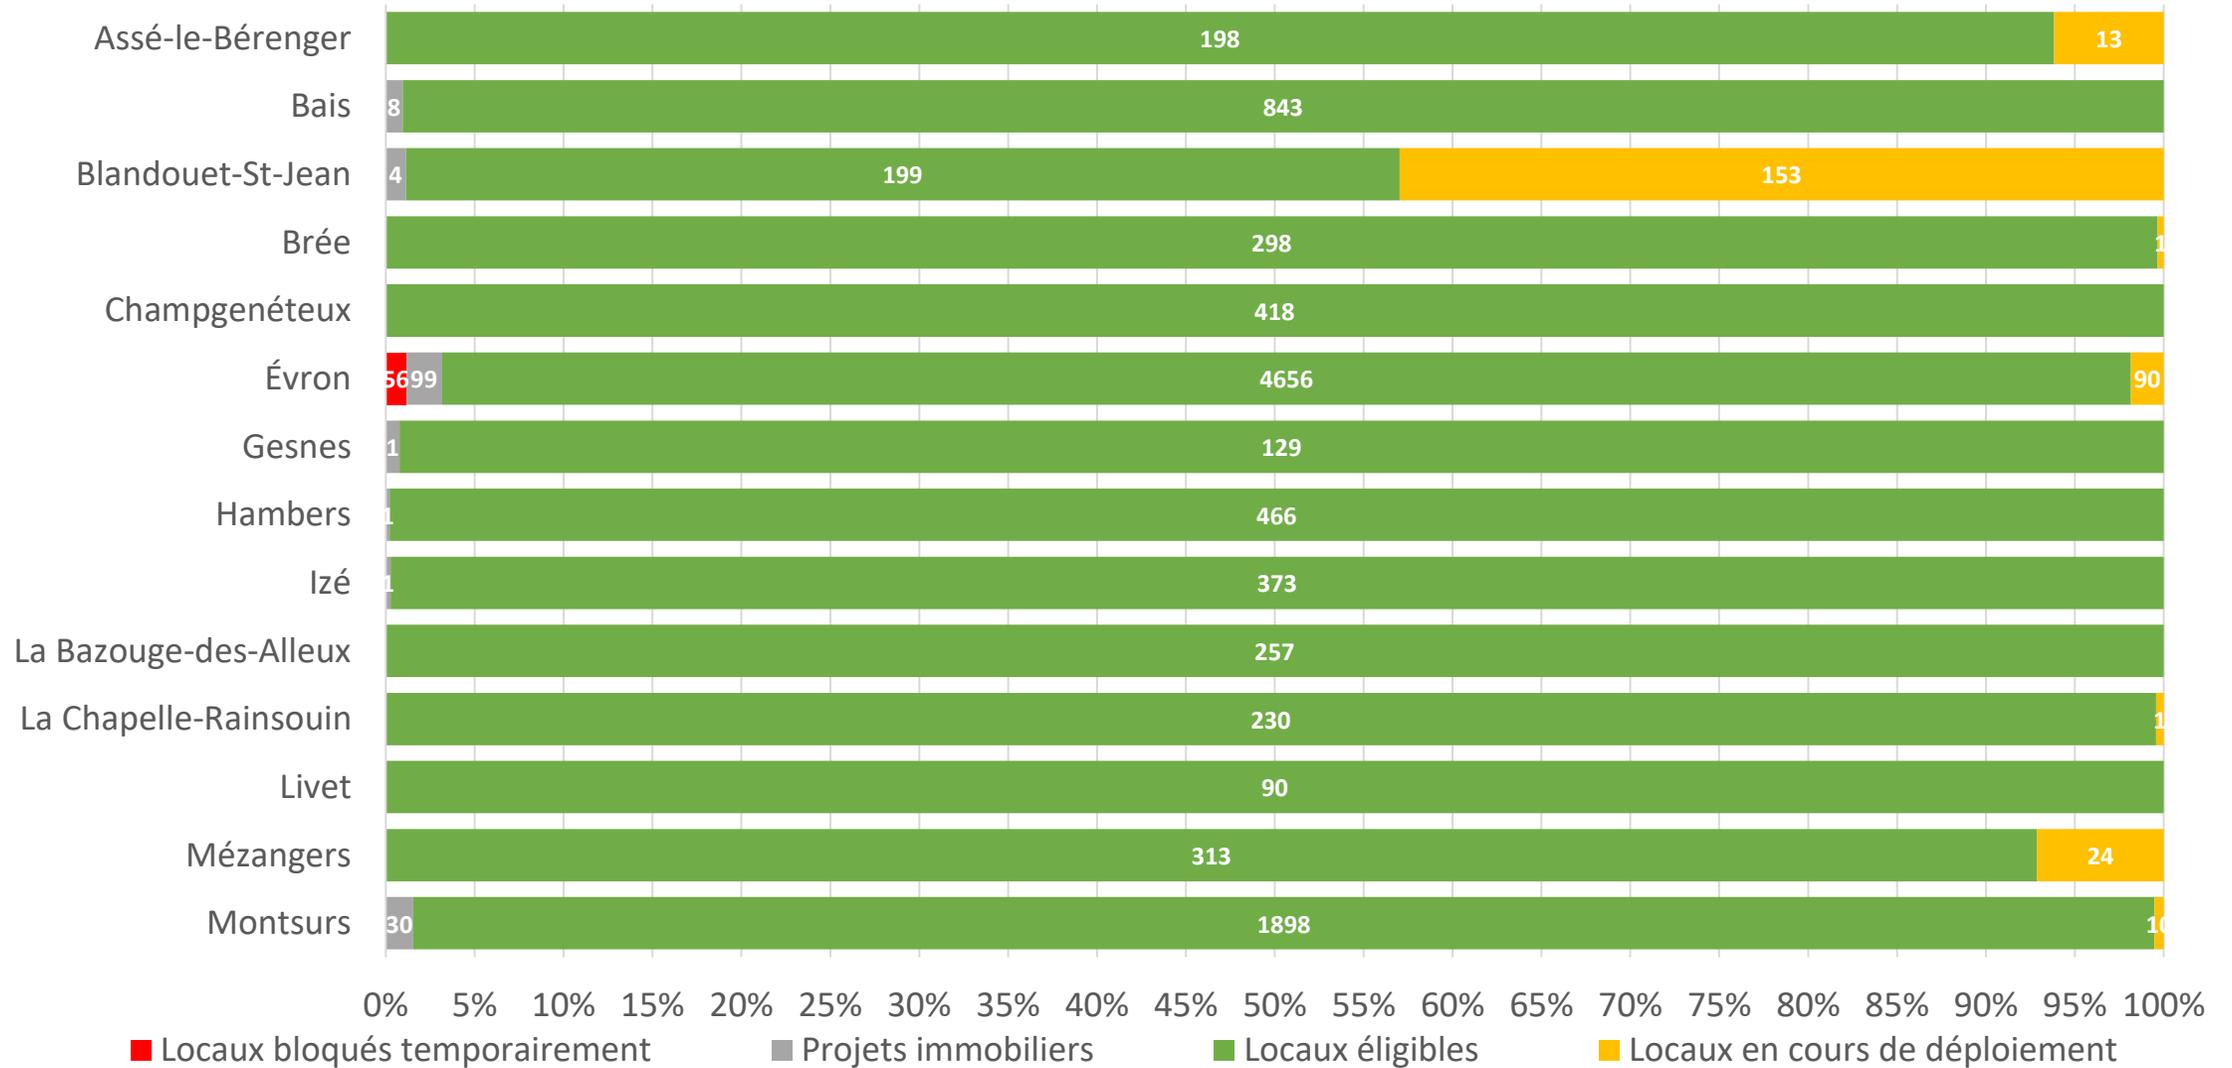


C.C. des Coëvrons (2/2)



- **Blandouet-St-Jean** : Afin de rendre éligibles les logements restants situés au nord de l'autoroute, il était nécessaire d'emprunter le pont d'autoroute. Lors de la réalisation des travaux, nous avons rencontré des difficultés techniques au niveau de ce pont en novembre 2022 et nous avons dû revoir nos études. Un nouvel accord a été trouvé avec Cofiroute et les travaux vont pouvoir reprendre au second semestre 2023.
- **St-Pierre-sur-Erve et Thorigné-en-Charnie** : Le déploiement de la fibre sur l'espace Natura 2000 de la Vallée de l'Erve répond à des exigences réglementaires très spécifiques et les délais d'obtention des autorisations administratives ont été plus longs, ce qui a retardé le déploiement sur ces communes.

Les autorisations administratives ayant été, à présent, obtenues, les études ont pu être relancées et les travaux devraient débuter très prochainement.

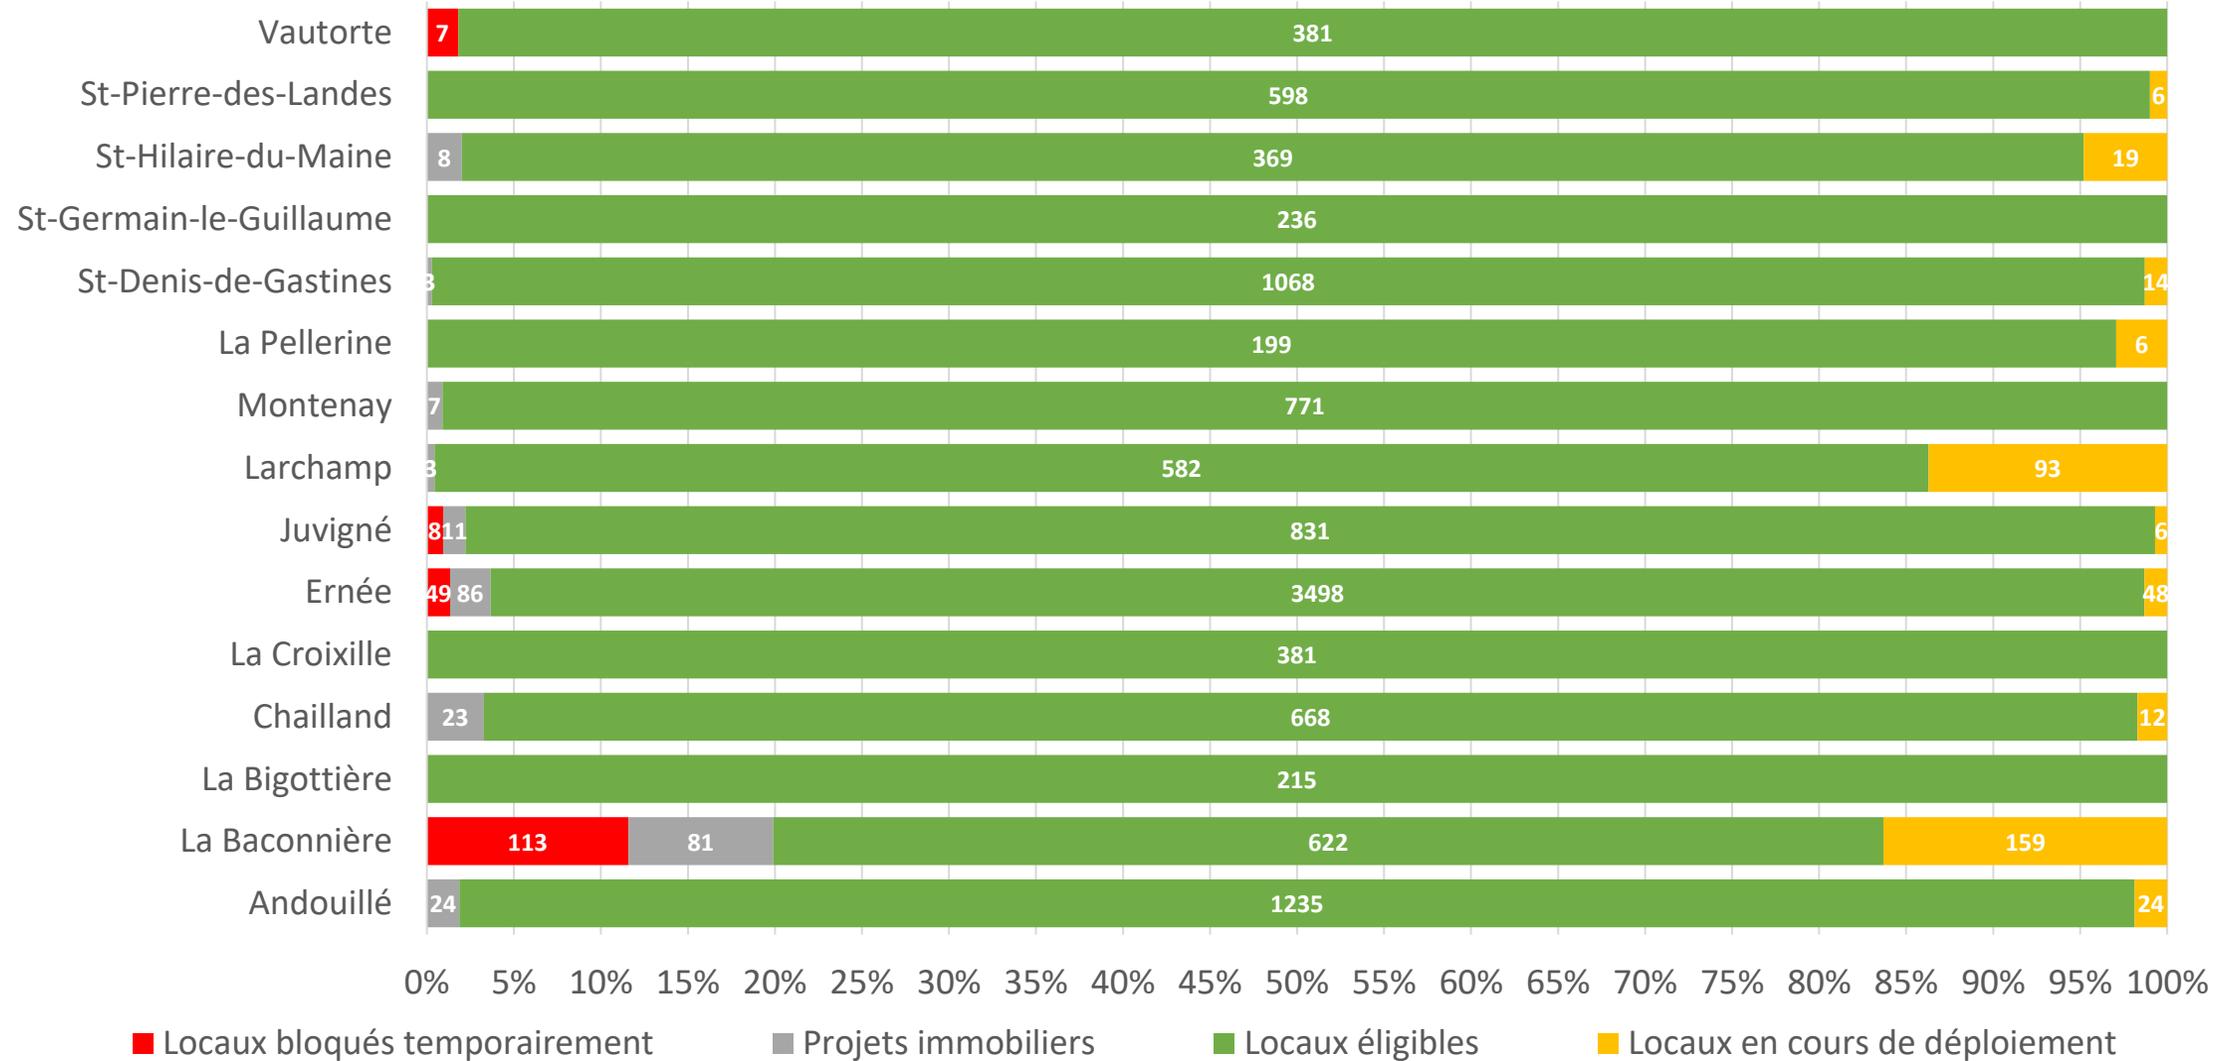


L'actualité de la C.C. de l'Ernée



- **Larchamp** : Le déploiement de la fibre à l'est de la commune nécessitait la plantation de poteaux le long de la D523 (secteur La Vigne). La mairie ayant donné son accord en début d'année 2023, la plantation de ces poteaux est en cours de réalisation permettant ainsi de finaliser le déploiement dans les prochaines semaines.
- **La Baconnière** : Les travaux d'enfouissement sur le secteur de la rue du Bourgneuf et de la rue Cormulets en 2022 ont impacté notre plan de marche. Les travaux sont prévus sur le 2^{ième} trimestre 2023

C.C. de Laval Agglomération

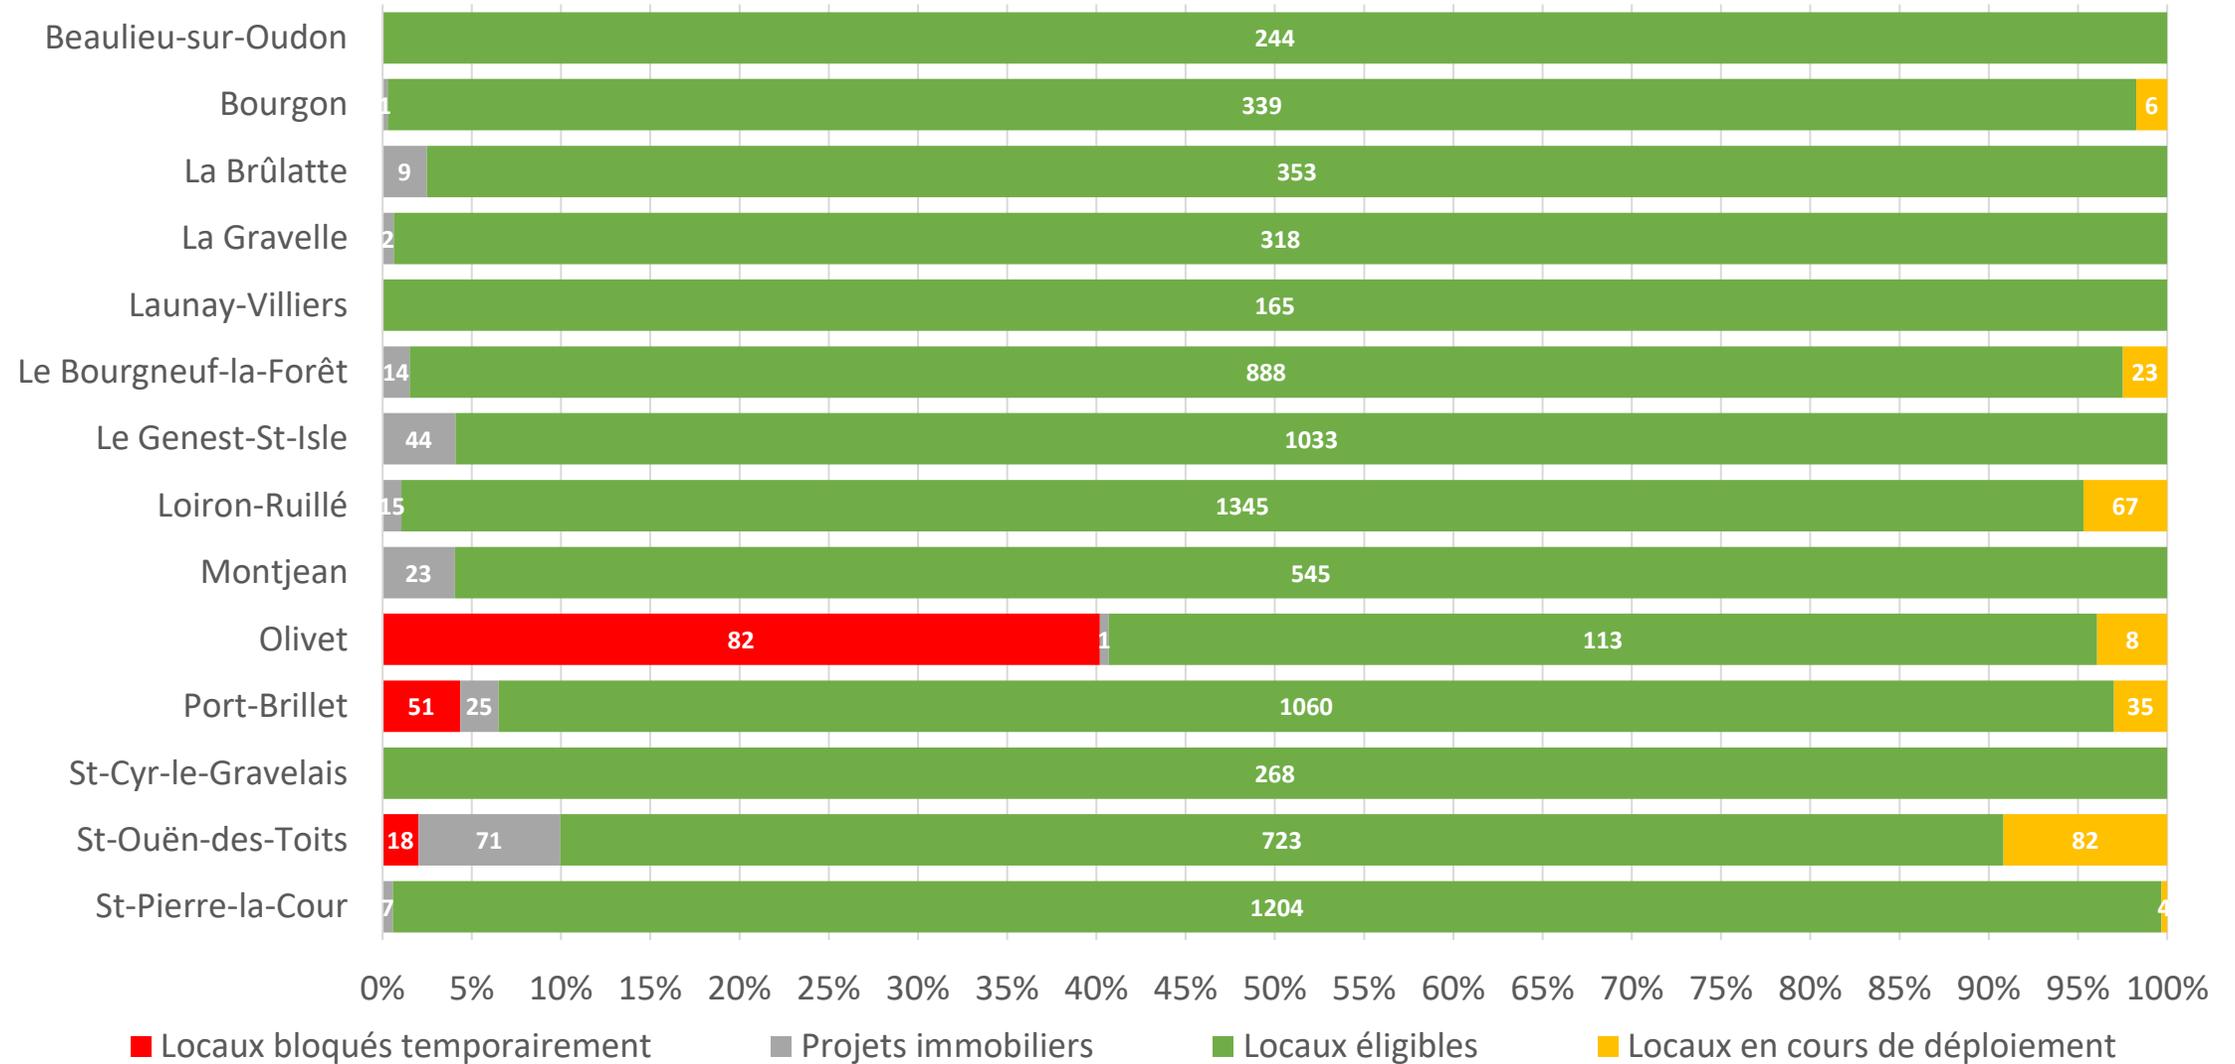


L'actualité de la C.C. de Laval Agglomération




- **Saint-Ouën-des-Toits** : A l'est de la commune, le déploiement de la fibre doit emprunter une infrastructure souterraine existante qui nécessite des travaux spécifiques. Ces travaux sont finalisés et le déploiement de la fibre devrait être terminé d'ici la fin du mois de juin.

C.C. de Mayenne Communauté (1/2)

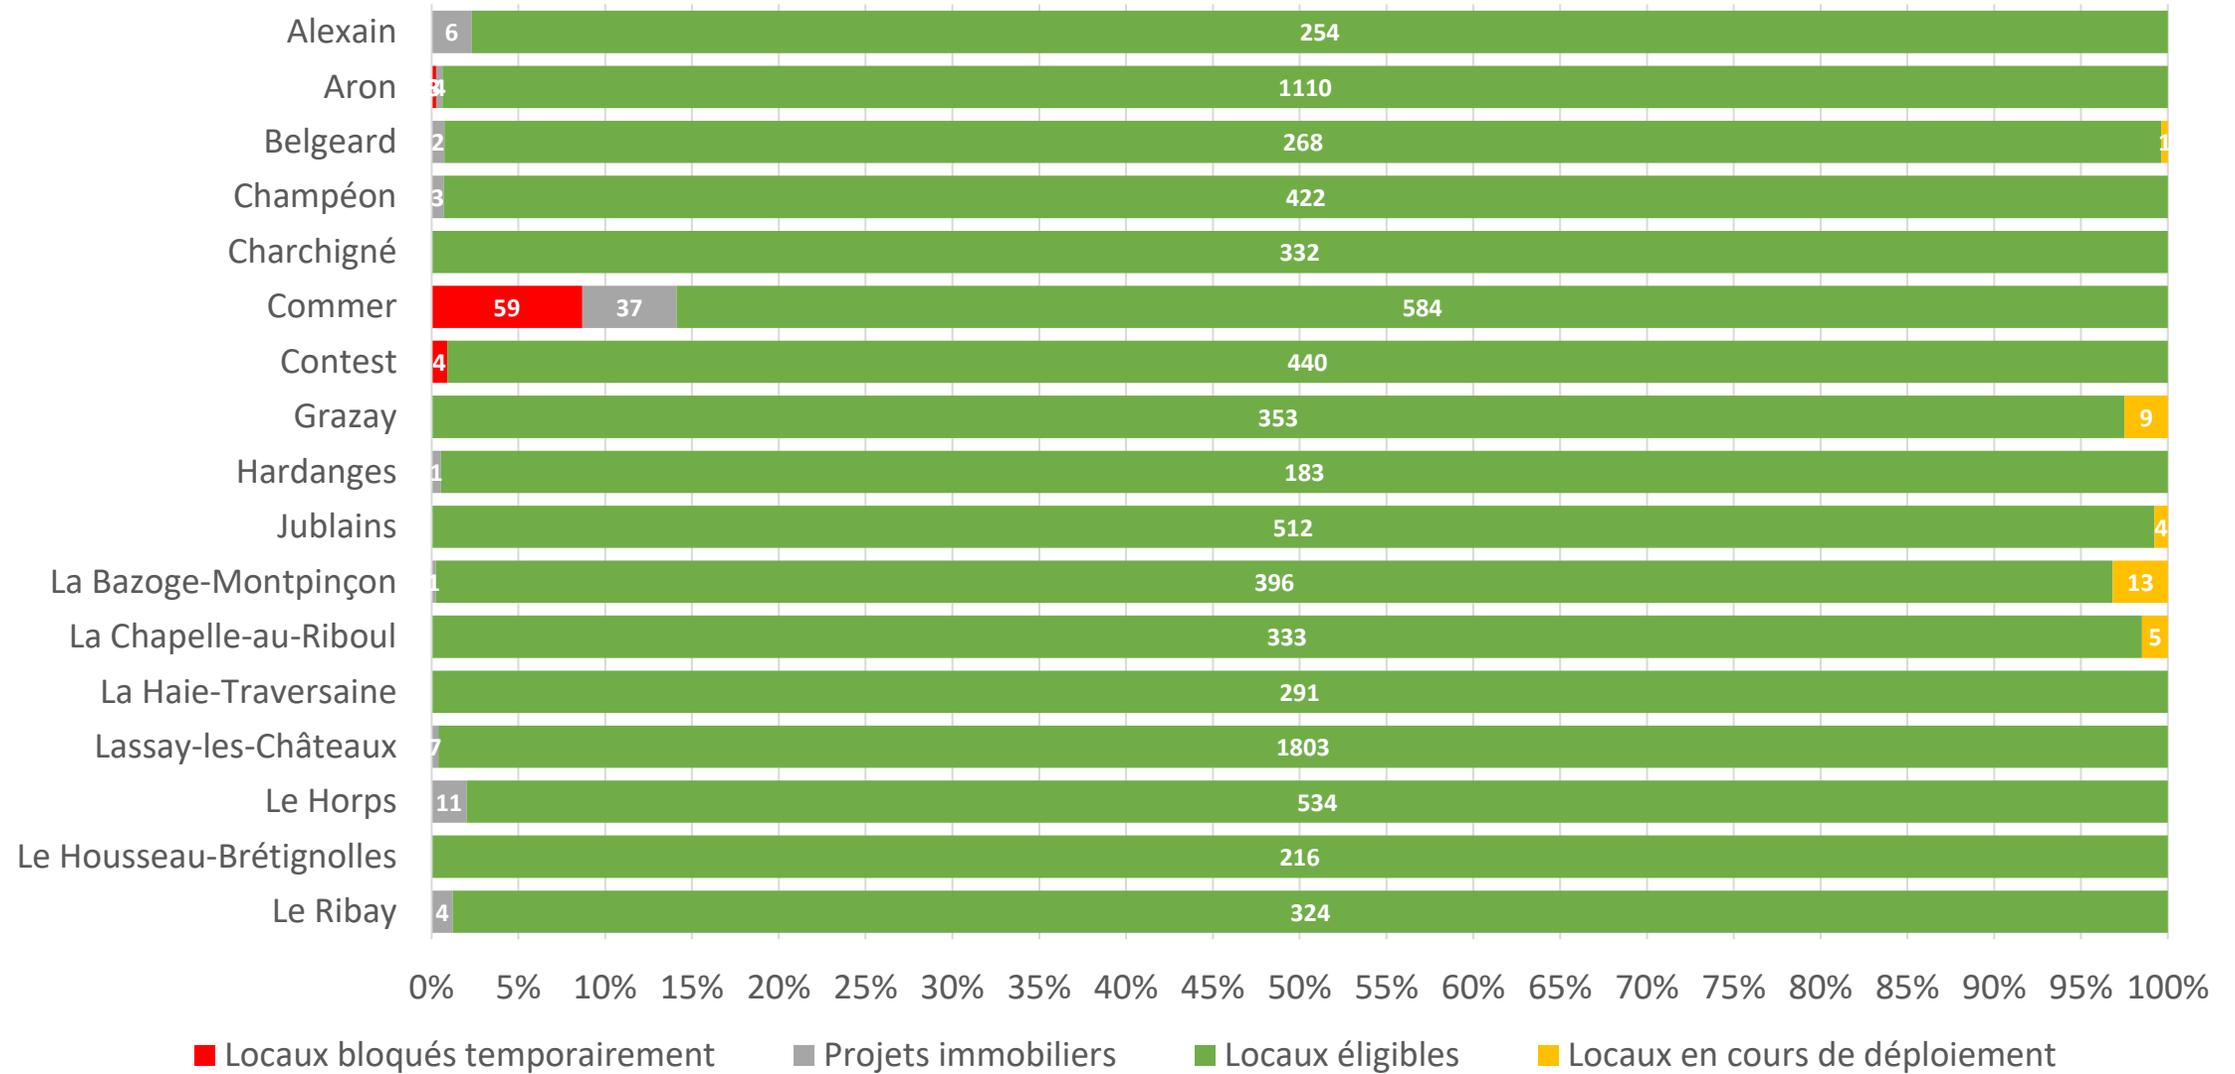

C.C. de Mayenne Communauté (2/2)

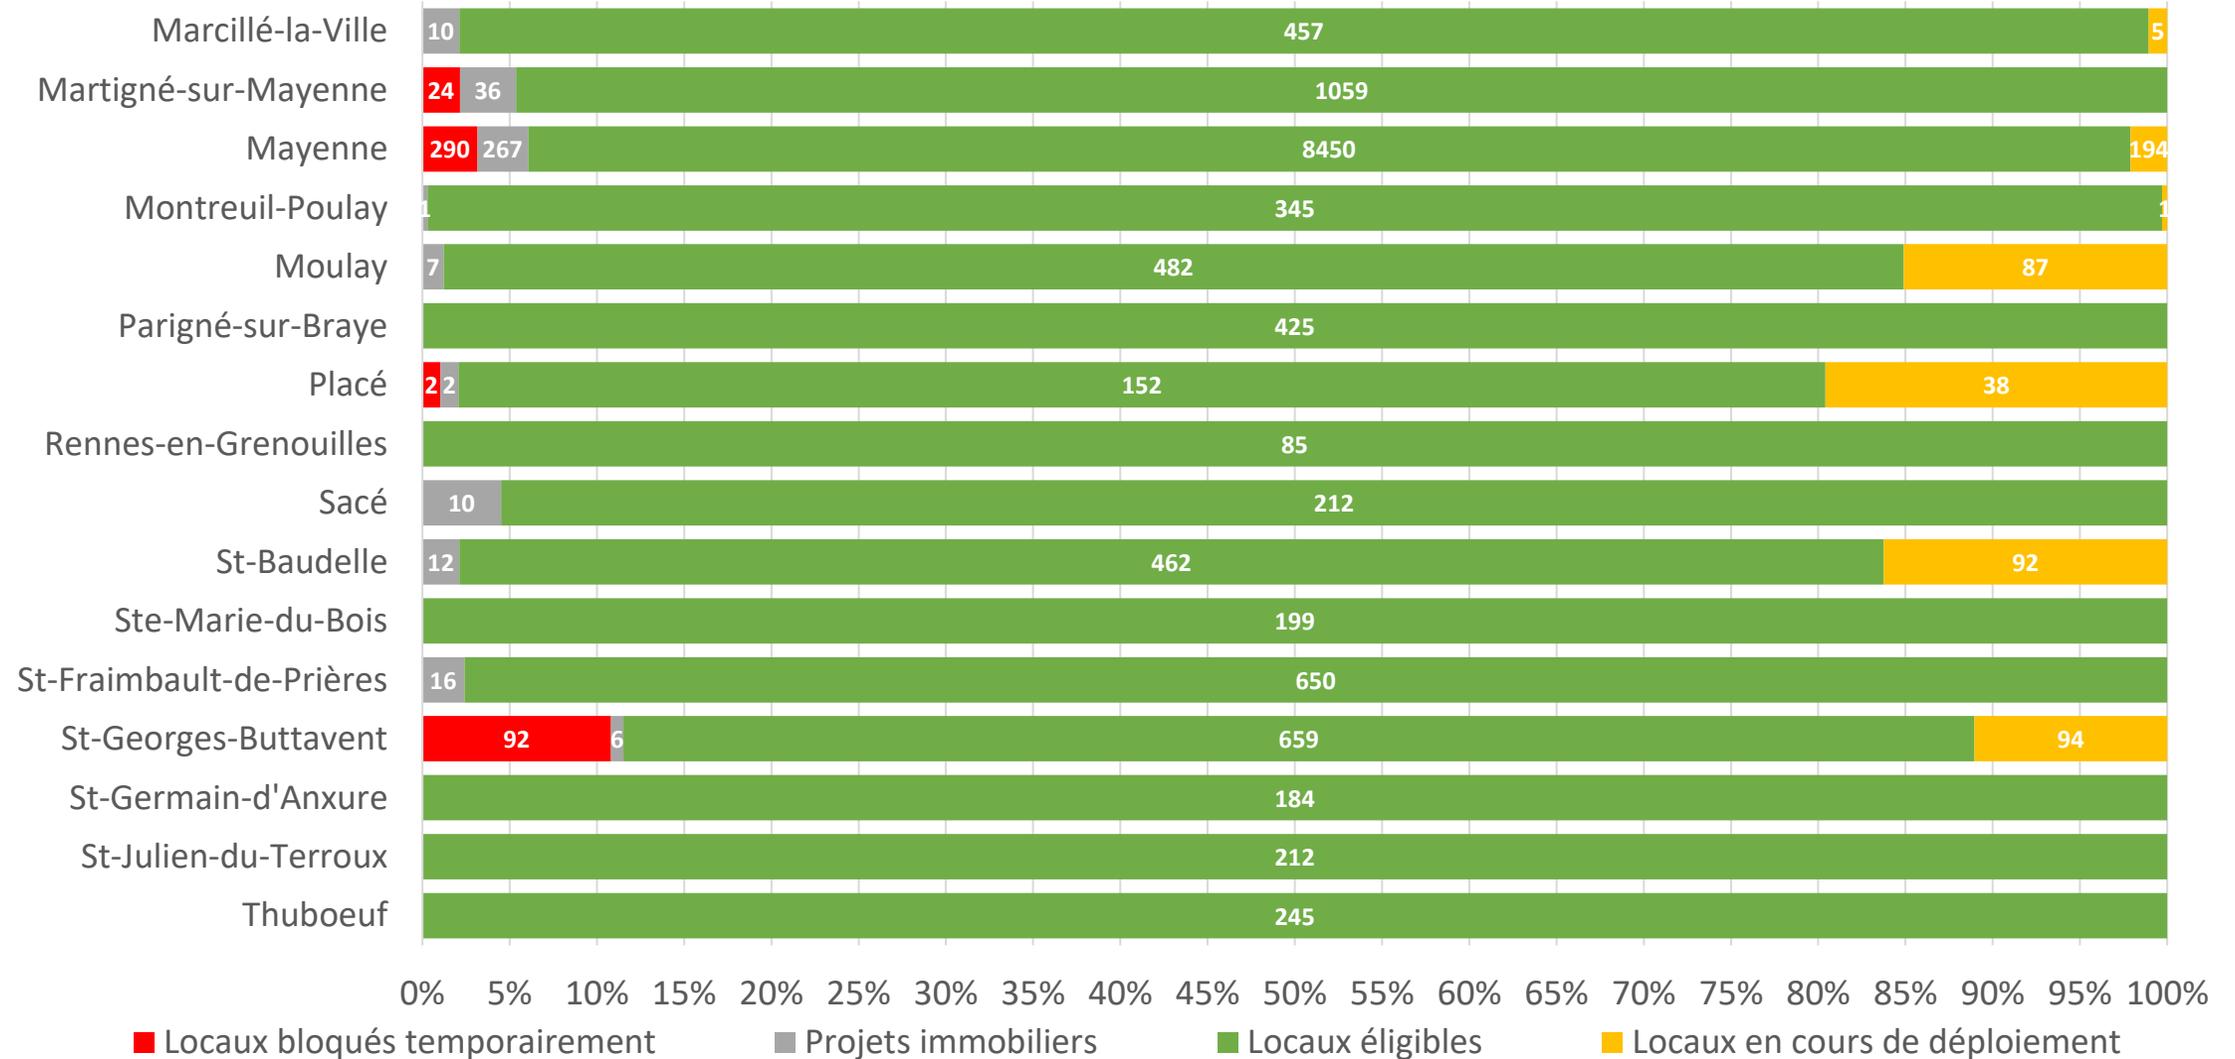

L'actualité de la C.C. de Mayenne Communauté



- **Moulay** : Suite notamment à la plantation problématique de quelques poteaux dans le bourg (le sol très rocheux nécessitant un équipement spécifique et/ou une modification du parcours de la fibre), le tirage de la fibre a repris.

Nous rencontrons toutefois des problèmes techniques lors des travaux de génie civil sur le secteur Sud Ouest de la commune, retardant de quelques semaines le déploiement initial

- **St-Baudelle** : Sur le secteur Est du bourg (en descendant vers la Mayenne), nos études prévoyaient initialement l'utilisation d'infrastructures existantes. Or, certaines ne sont, malheureusement, pas réutilisables, nous obligeant à engager des travaux de génie civil supplémentaires. Les études sont en cours et les travaux devraient pouvoir reprendre dans les prochaines semaines


Sur le secteur Rue des Mimosas/Rue des Camélias, nous sommes en attente des travaux d'effacement de réseaux, planifiés au second semestre 2023, pour reprendre le déploiement.

- **St-Georges-Buttavent** :


Au niveau de la ruelle Sensitive, des études sont en cours pour trouver une solution au déploiement (ruelle très étroite sans accotement avec des poteaux ENEDIS en bois non réutilisables)

Sur le secteur Ouest de la commune (périmètre adjacent à la RN12), les demandes d'autorisation de travaux sont en cours auprès des services concernés et le déploiement est prévu sur le 2d semestre 2023.


C.C. du Mont des Avaloirs (1/2)

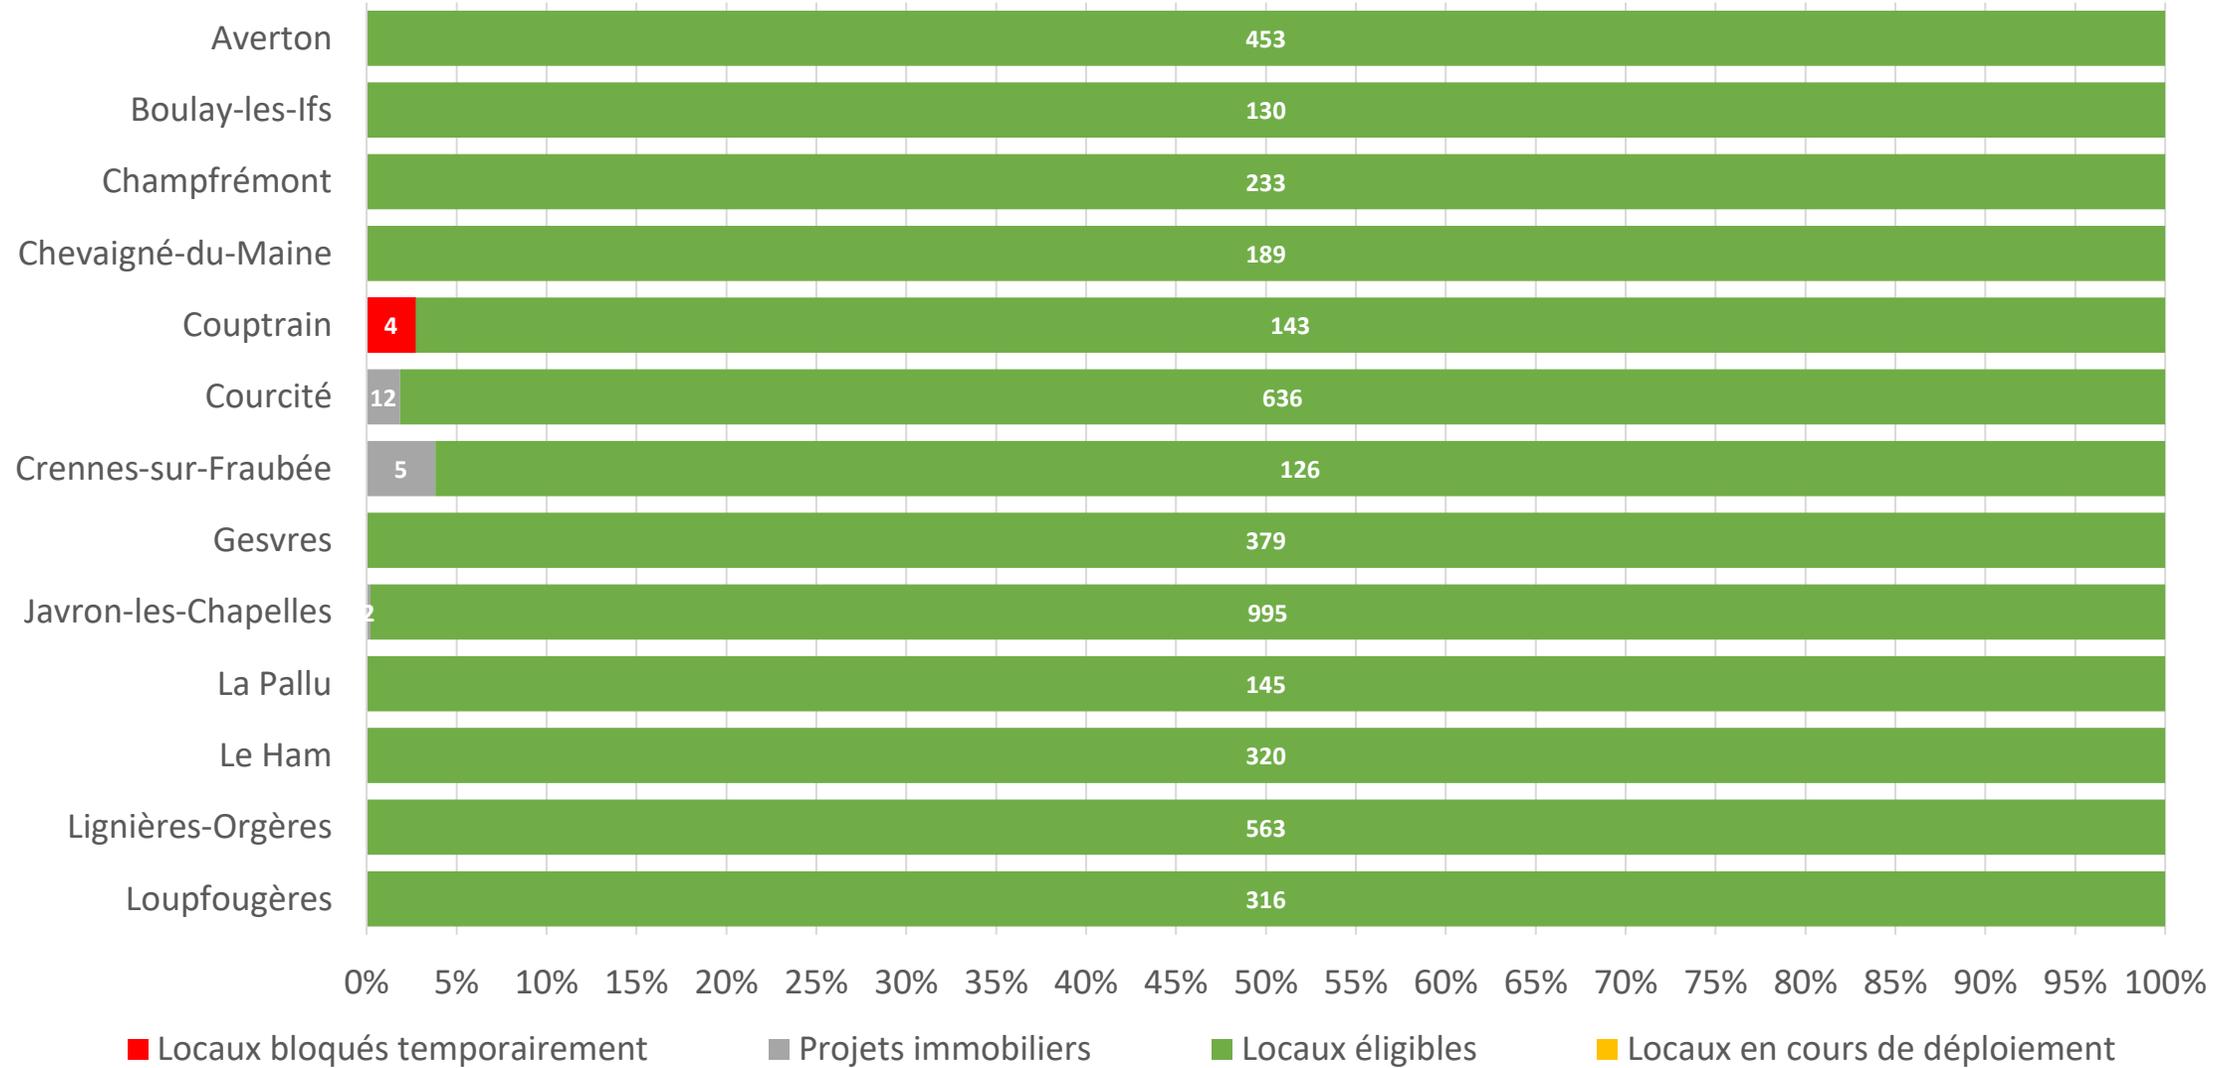


C.C. du Mont des Avaloirs (2/2)

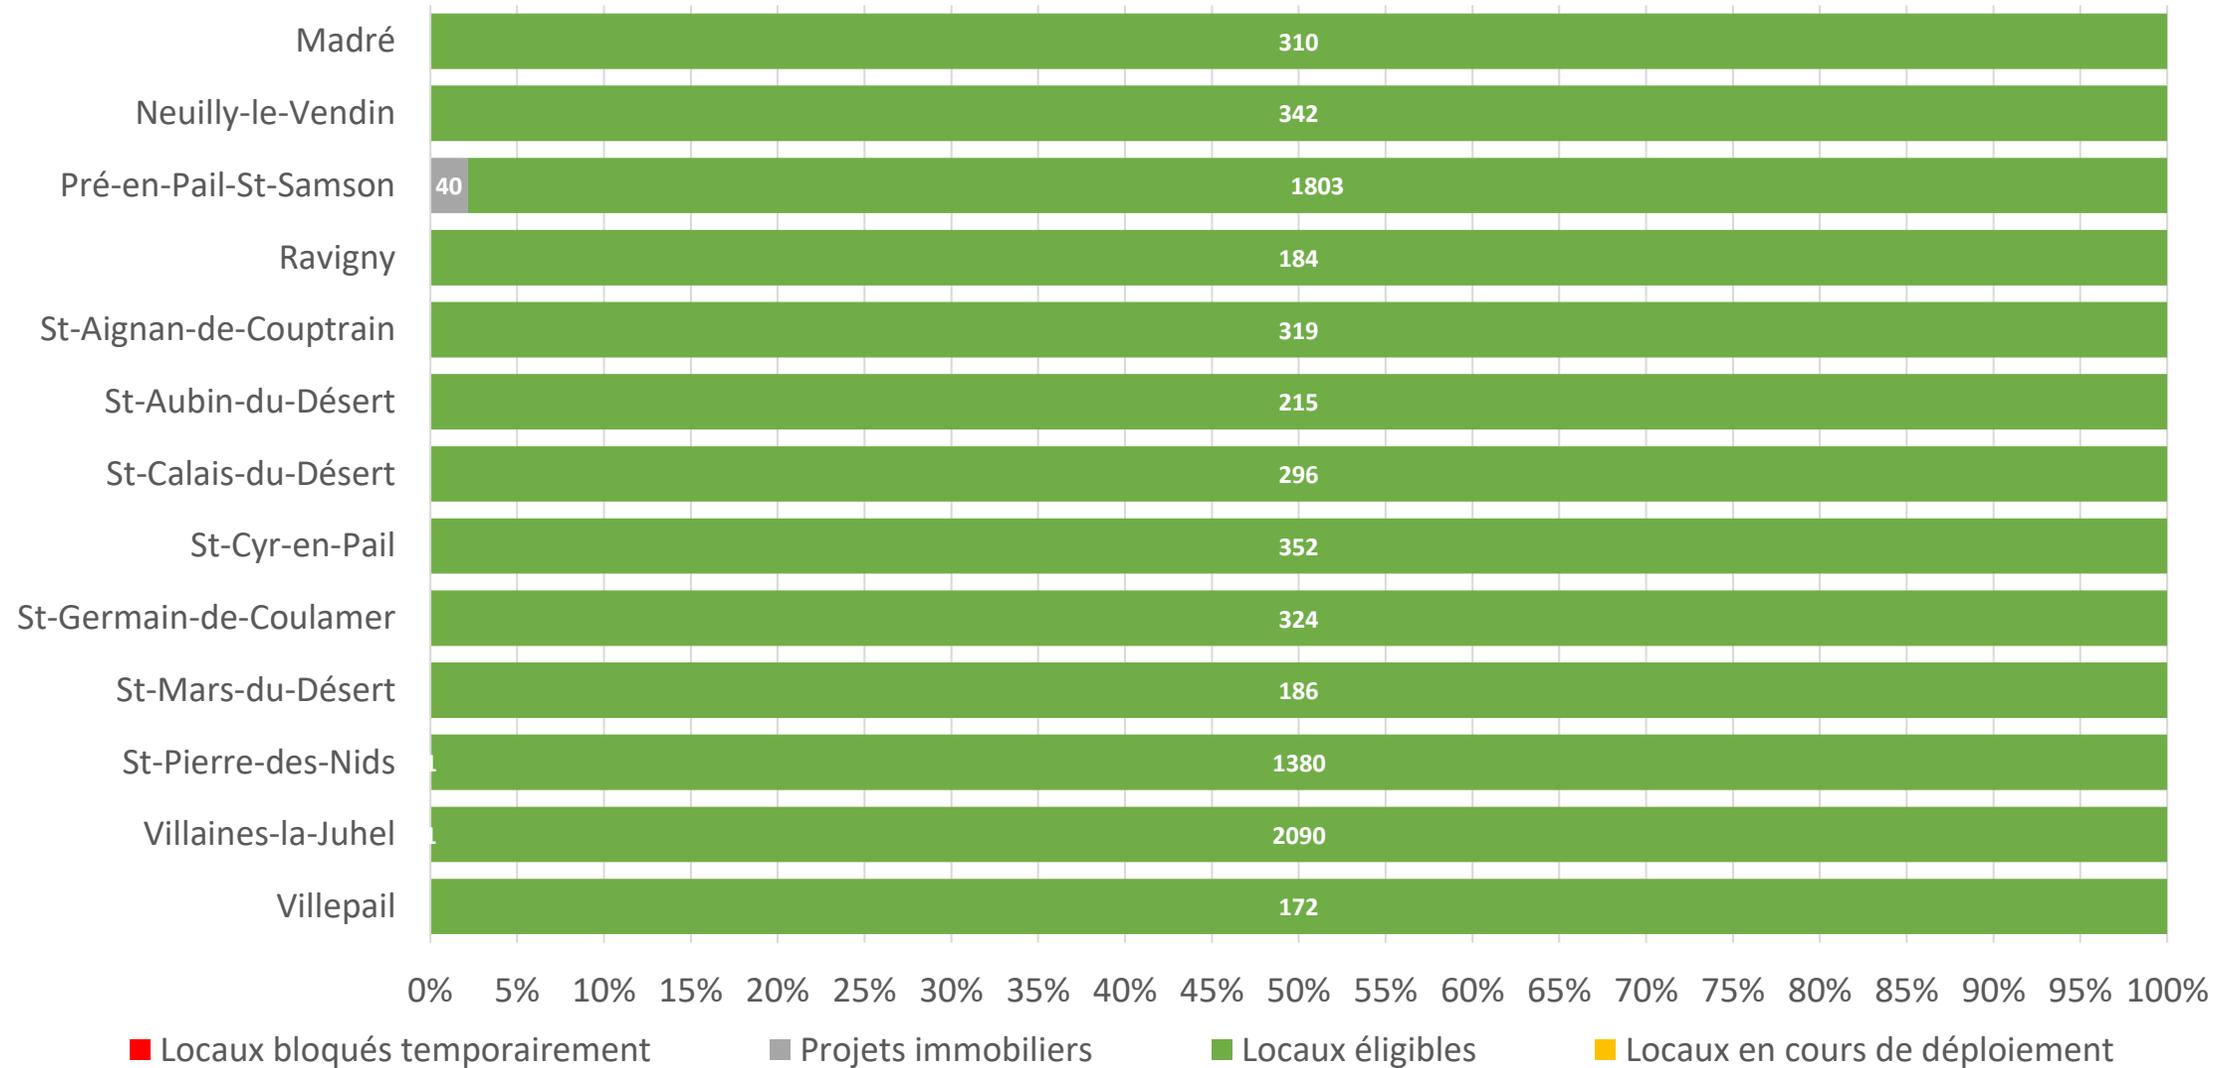


C.C. du Pays de Château Gontier

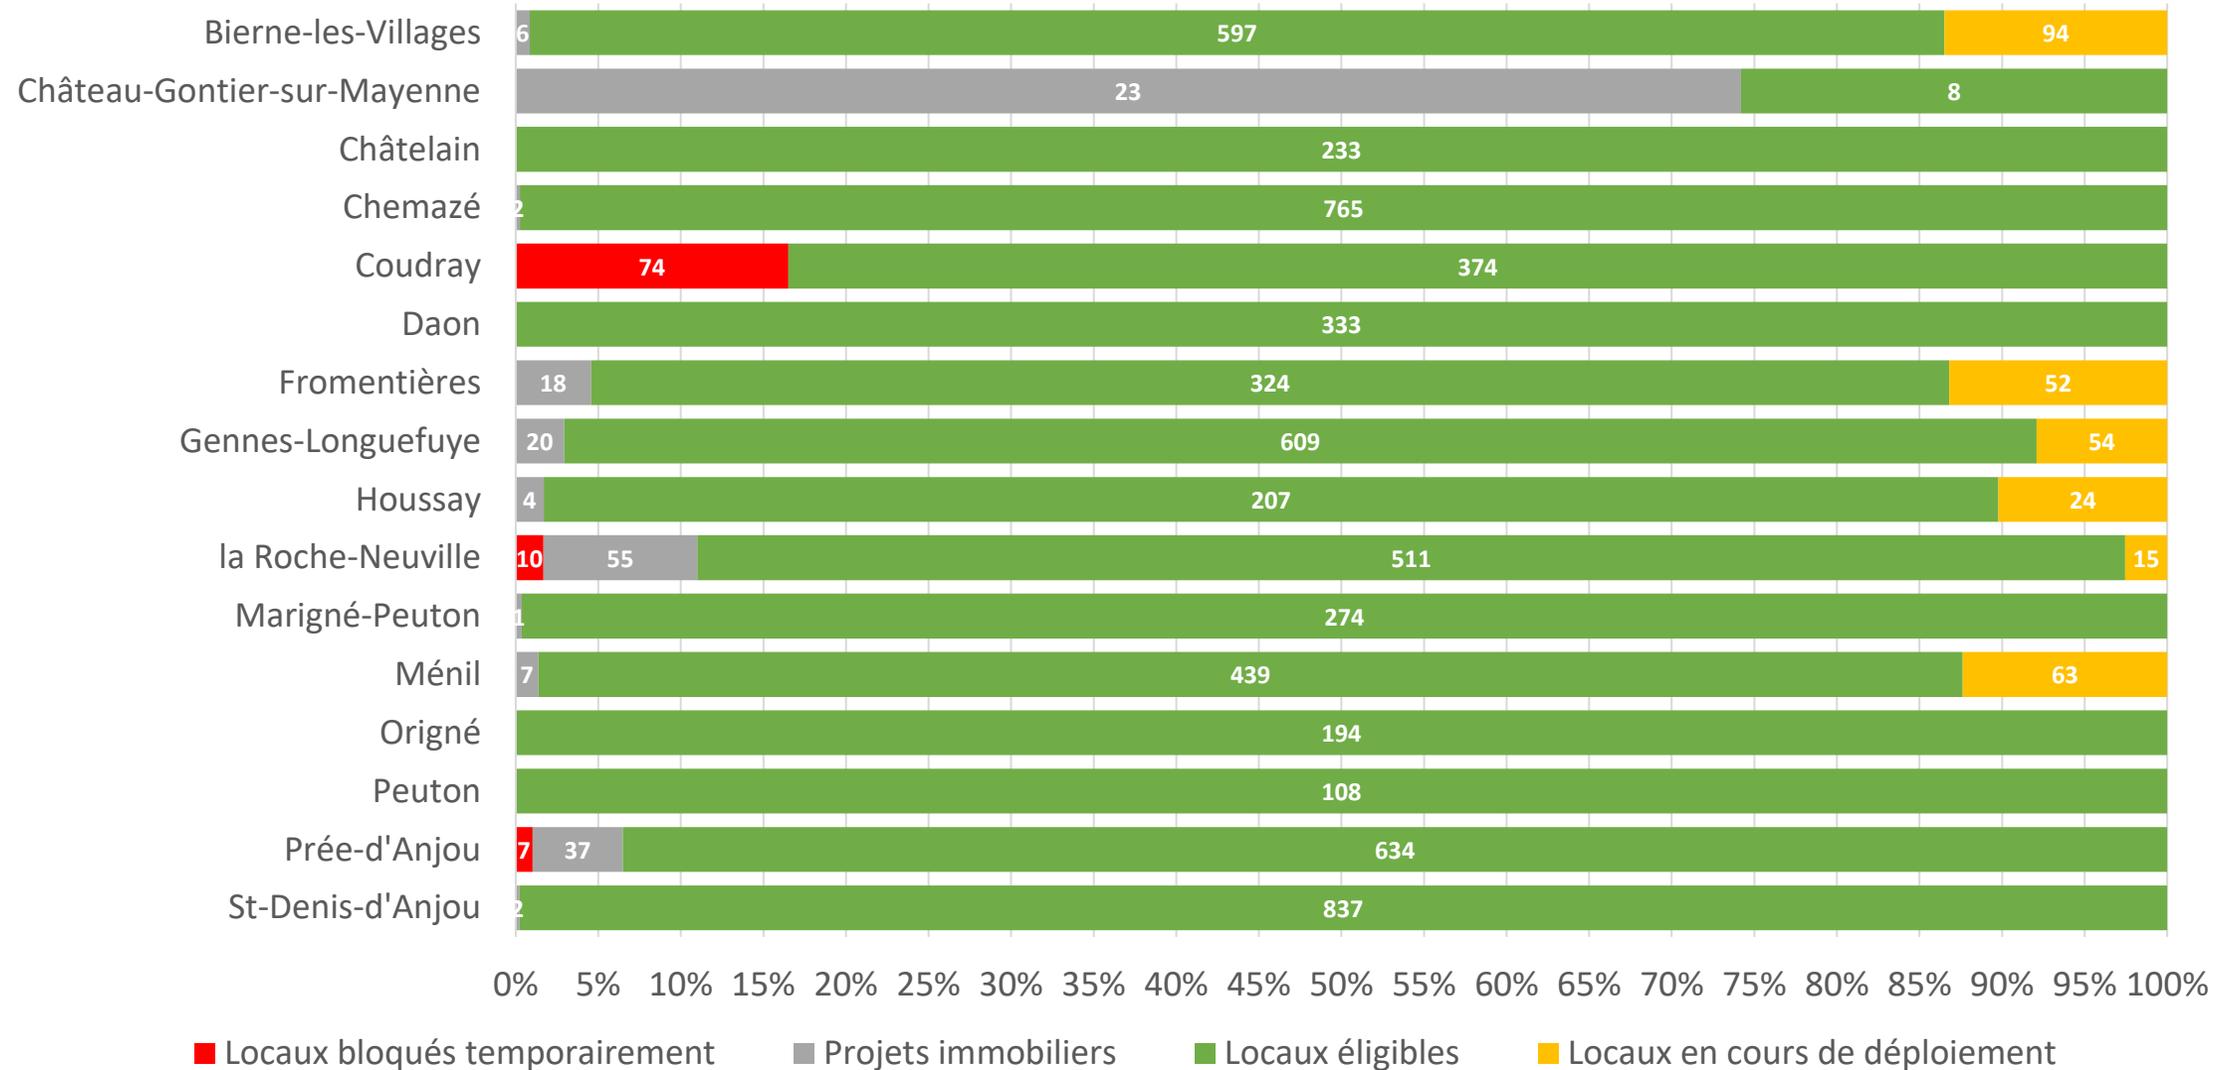





**Pas d'actualités spécifiques
hormis que les travaux se poursuivent**

C.C. du Pays de Craon (1/2)

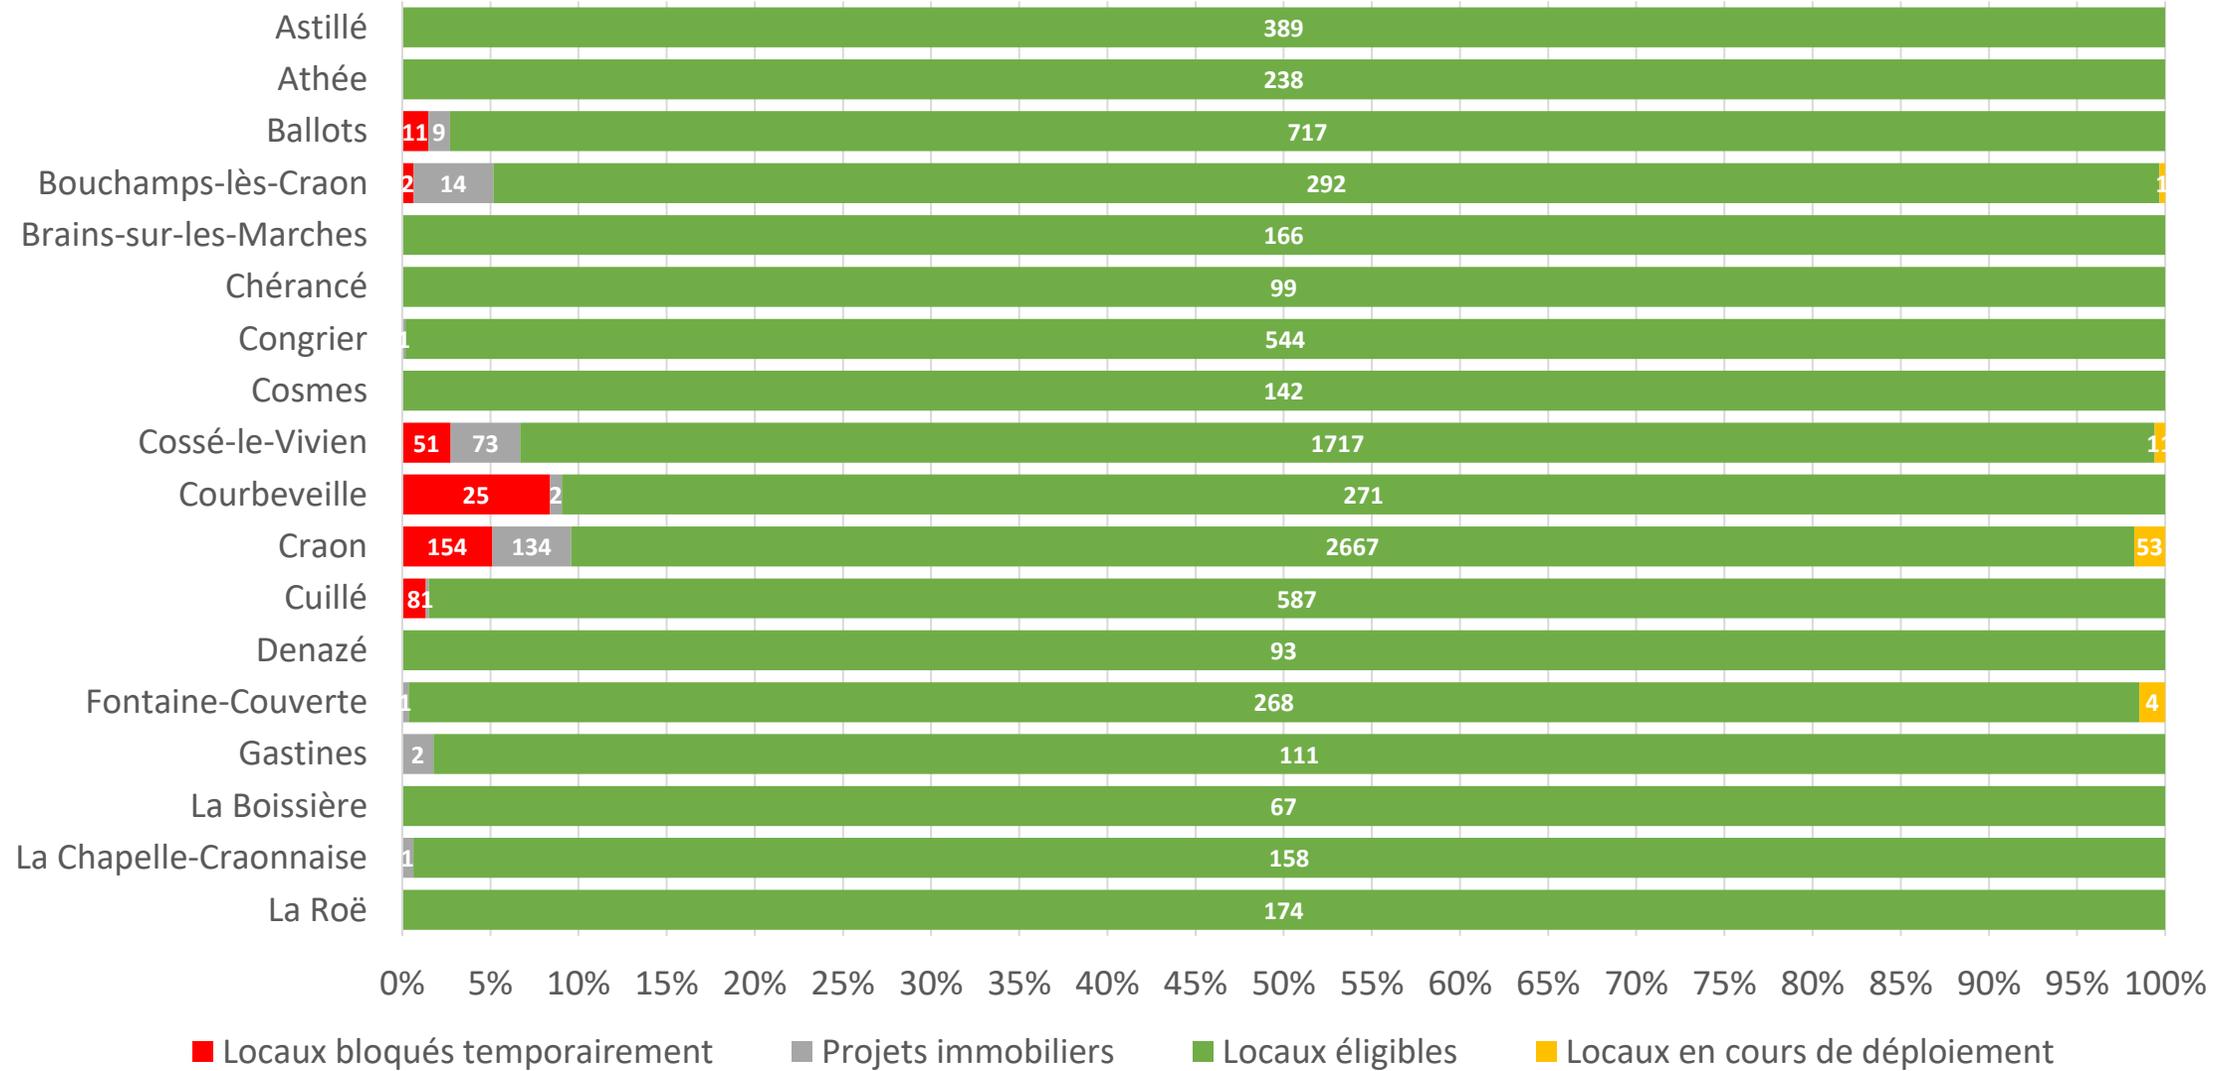


C.C. du Pays de Craon (2/2)

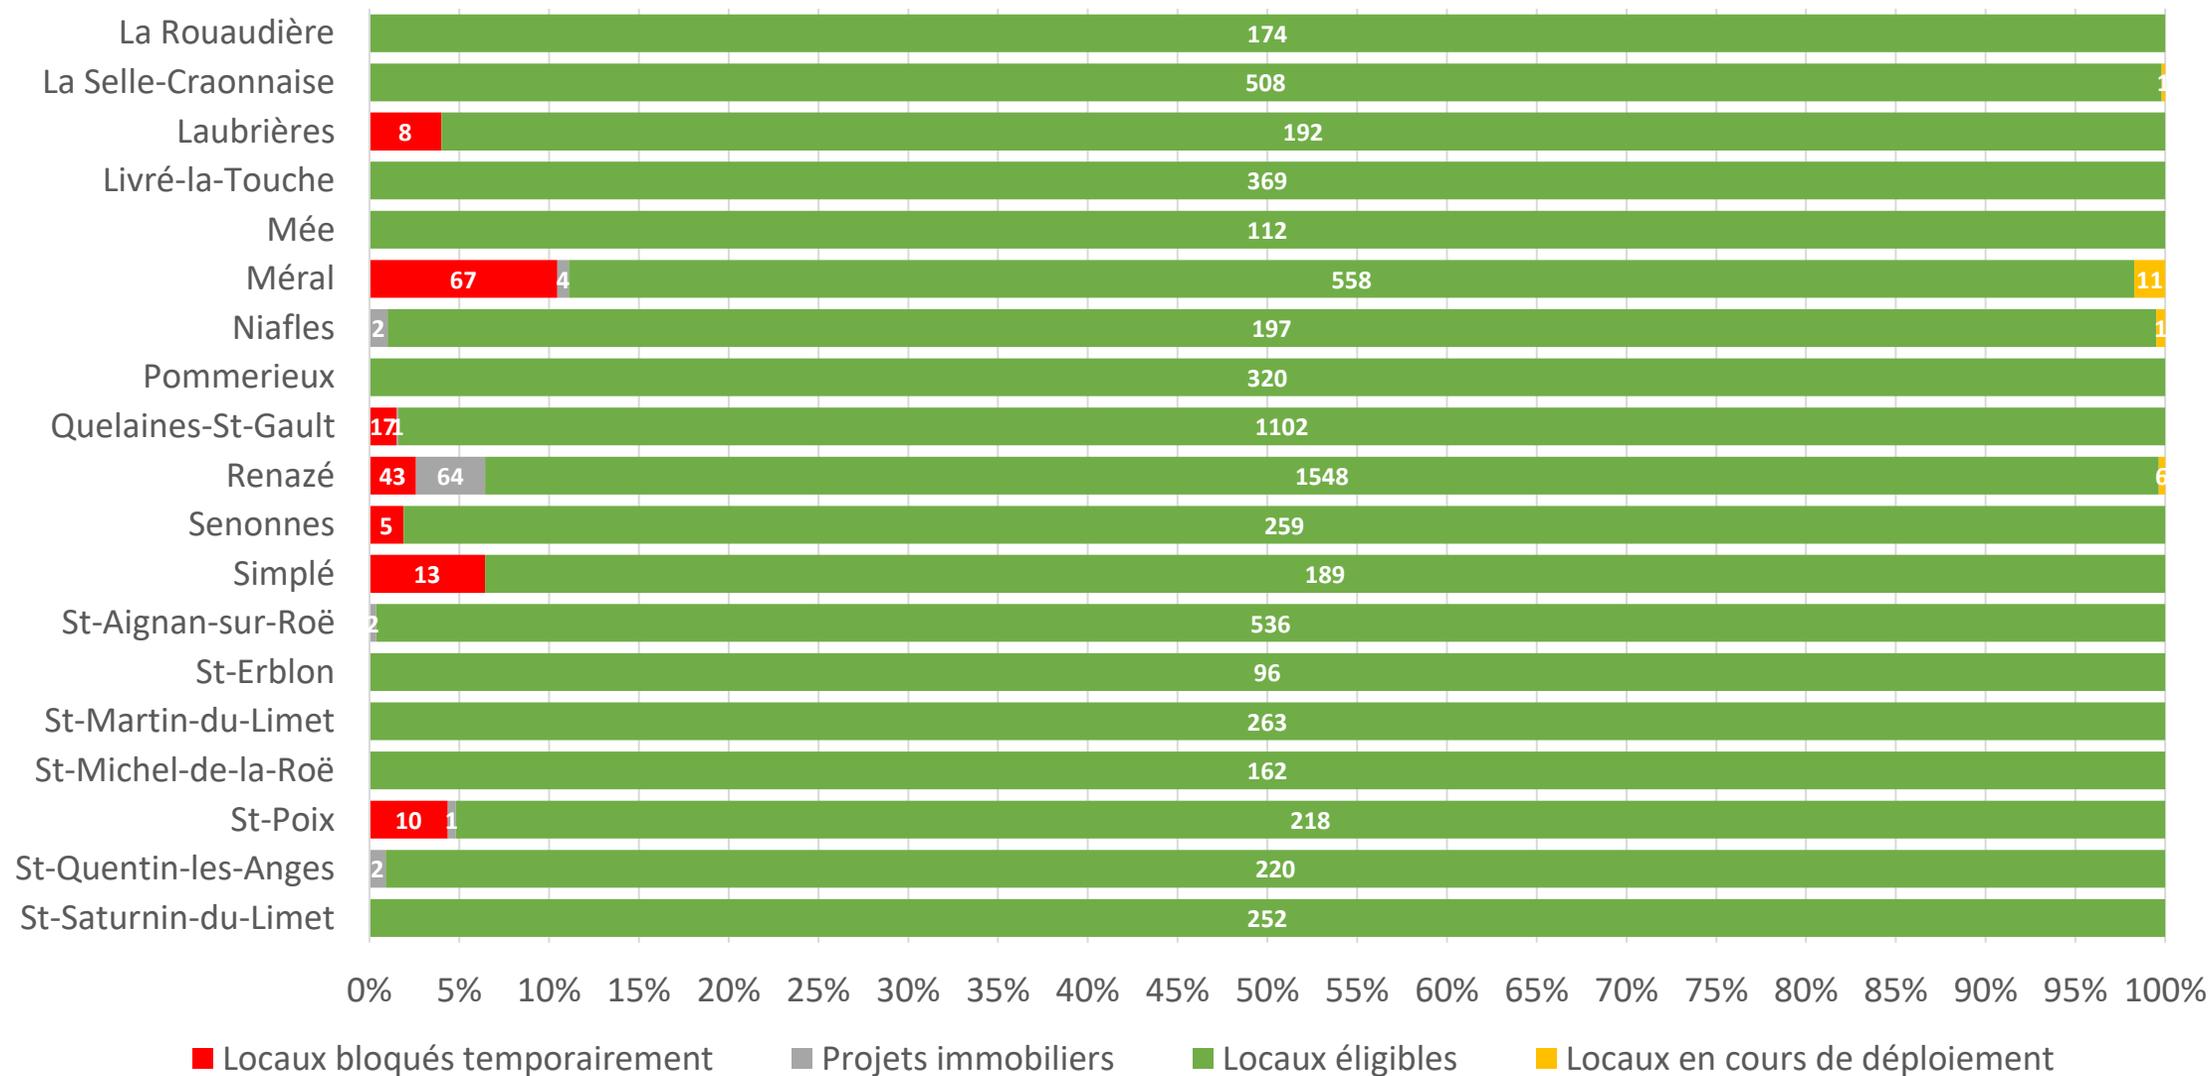



**Pas d'actualités spécifiques
hormis que les travaux se poursuivent**

C.C. du Pays de Meslay-Grez

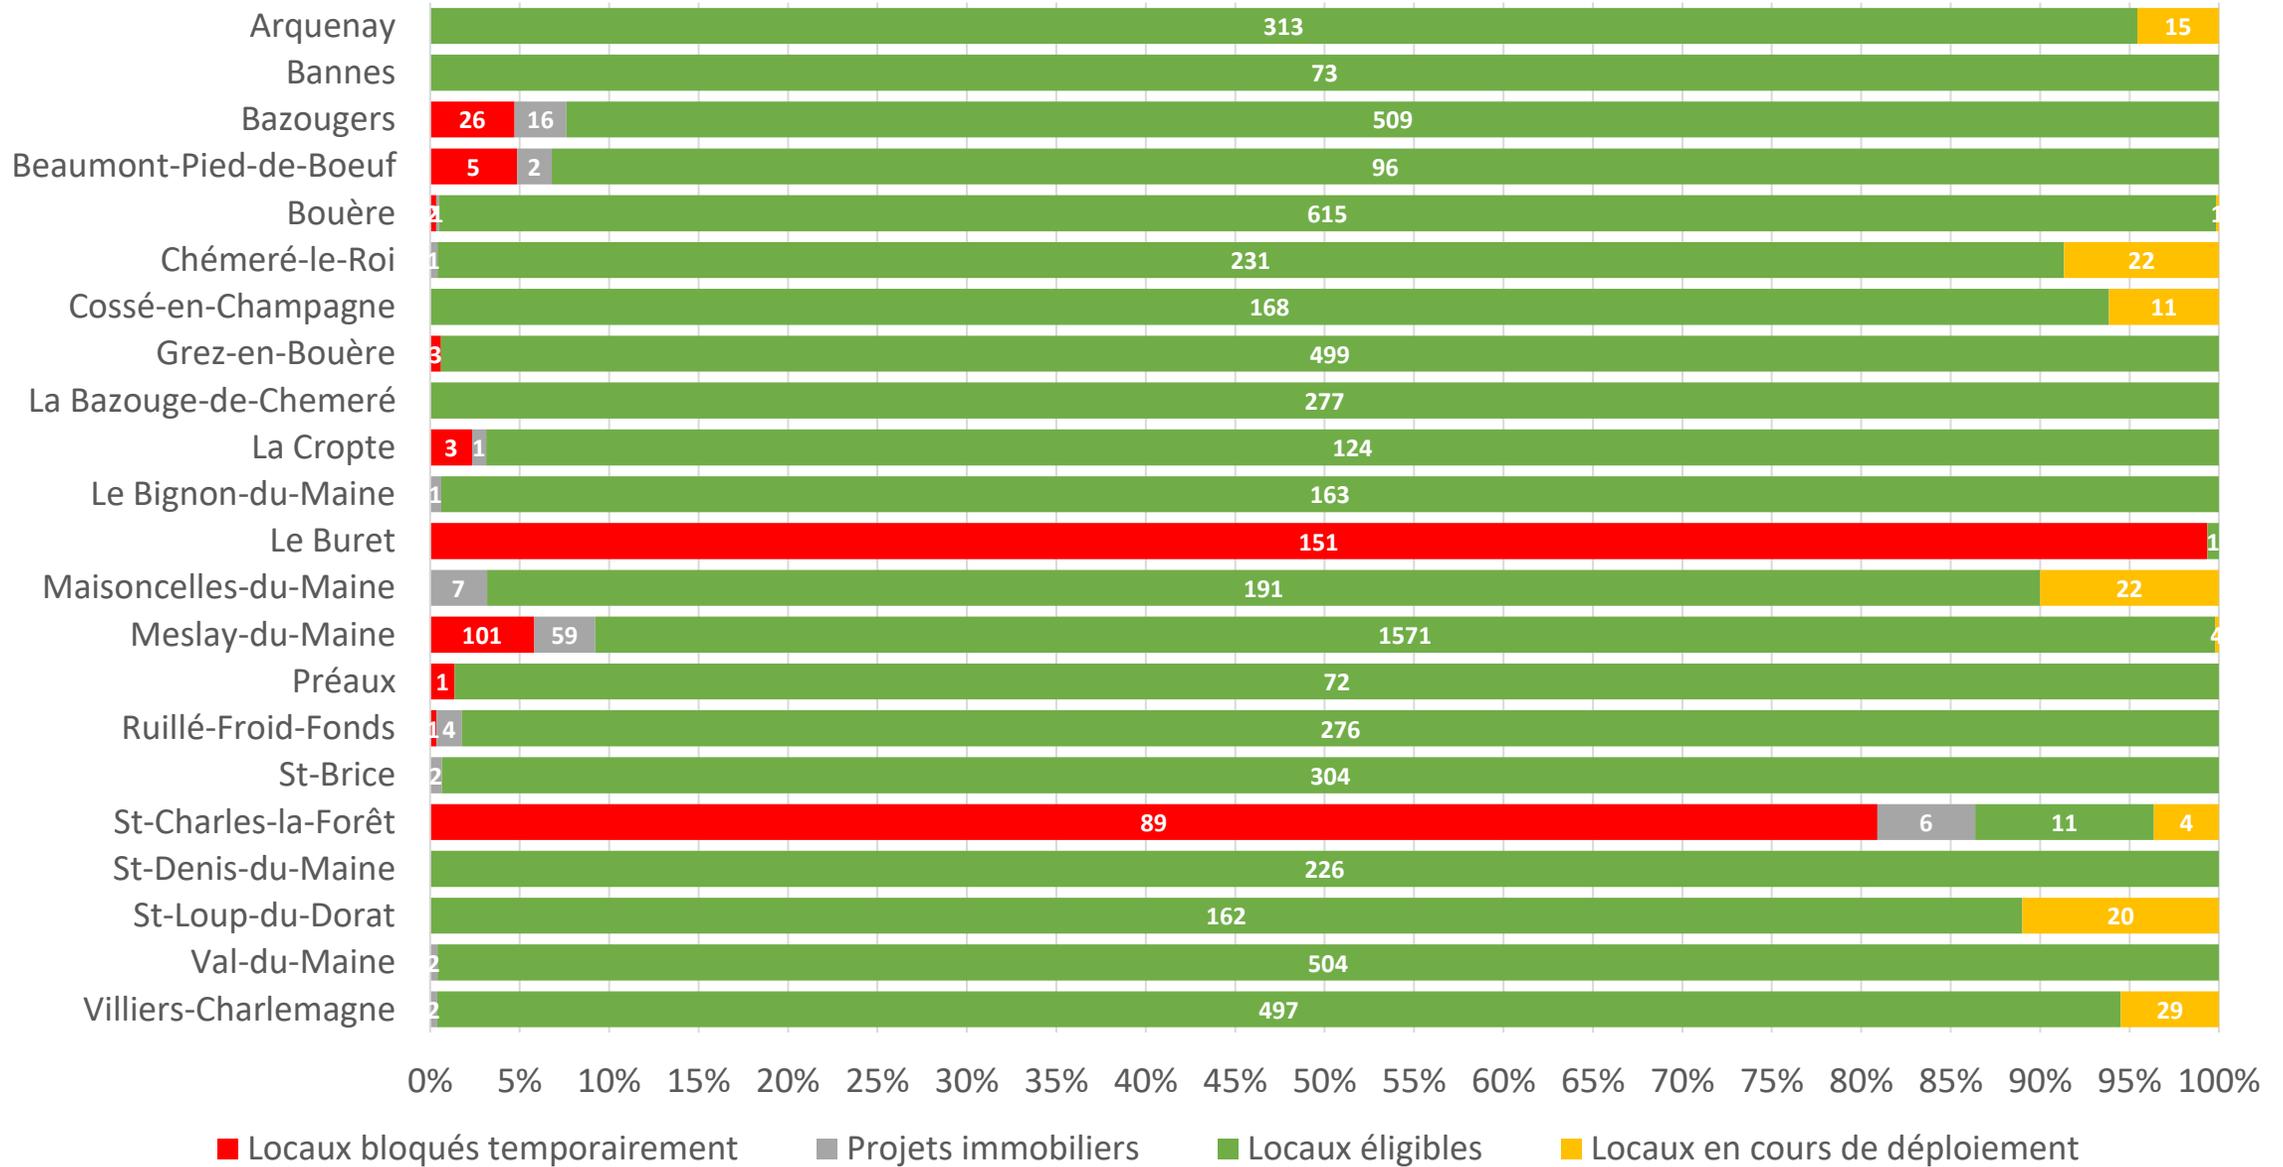

L'actualité de la C.C. du Pays de Meslay-Grez



- **Le Buret et Saint-Charles-la-Forêt :** Le déploiement de ces deux communes est impacté par les travaux d'enfouissement qui ont été réalisés dans le centre bourg de Le Buret. Ces travaux étant finalisés, les études pour déployer la fibre sur ces communes ont pu être lancées et les travaux de déploiement débuteront au second semestre 2023.
